

The page features three large, light blue, 3D-rendered circles of varying sizes. Two thin blue lines originate from the top left and extend diagonally across the page, passing behind the circles. The largest circle is at the bottom right, a medium one is at the top center, and a smaller one is in the middle right.

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

**Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı**

**2020 Yılı Yatırım Programı İzleme
ve Değerlendirme Raporu**

Mart 2021

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	4
GENEL DEĞERLENDİRME	5
MİSYON – VİZYON	5
FAALİYET ALANLARI	6
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	13
ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	14
2020 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI	15
ÖNERİLER	22

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1	2020 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 2	2020 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 3	2020 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4	2020 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	7
Tablo 5	2020 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	7
Tablo 6	2018, 2019 ve 2020 Yılları Personel Sayıları	8
Tablo 7	2018, 2019 ve 2020 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	9
Tablo 8	2018, 2019 ve 2020 Yılları Akademik Personel Sayıları	9
Tablo 9	2020 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	10
Tablo 10	2020 Yılı Misafirhane Bilgileri	10
Tablo 11	2020 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	11
Tablo 12	Sosyal Alanlar	11
Tablo 13	Toplantı – Konferans Salonları	11
Tablo 14	Hizmet Alanları	12
Tablo 15	Taşıt Bilgileri	12
Tablo 16	Kütüphane Kaynakları	12
Tablo 17	2020 Yılı Yatırımlarımız	13
Tablo 18	2020 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	15
Tablo 19	Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	15
Tablo 20	Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 21	Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 22	Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 23	Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödenegi Revize Ödenek ve Harcama	20
Tablo 24	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı Gerçekleşme Bilgileri	21
Tablo 25	Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	22
Tablo 26	DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma-Mer. Araş. Lab. İlave Alt Yapı	22

YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2020 yılında toplam 17.510.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde eklemeler ve düşmeler ile birlikte 24.878.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2020 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2020 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak sunulmuştur.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
R e k t ö r

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON-VİZYON



MİSYON

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikle, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin coğrafi ve stratejik konumu dikkate alınarak bölgeye sağlık, eğitim sosyo-kültür ve ekonomi alanında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkemizin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürmek.

VİZYON

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.



1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

1.3 TEMEL AMAÇLAR

Amaç-1) Eğitim öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli kaynağı yetiştirmek.

Amaç-2) Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını artırmak.

Amaç-3) Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini artırmak.

Amaç-4) Yerleşke alt yapısının üniversite personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak.

Amaç-5) Üniversitemizde girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2020 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje için 17.510.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar yılsonu toplam 24.308.854 TL olarak gerçekleşmiştir.

2020 yılında 18.798.000 TL ödenek (1.288.000 TL yedek ödenek) hazine yardımı olarak verilmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 12.000.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık Sektörüne döner sermaye ile 7.288.000 TL ve DKH Sosyalden de 10.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2020 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
12.000.000	17.079.000	16.755.091	%140	%98


Tablo 2: 2020 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
5.500.000	7.888.000	7.548.570	%137	%95

Tablo 3: 2020 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödenegi (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödenegine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödenegine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
10.000	10.000	5.192	%52	%52

Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı

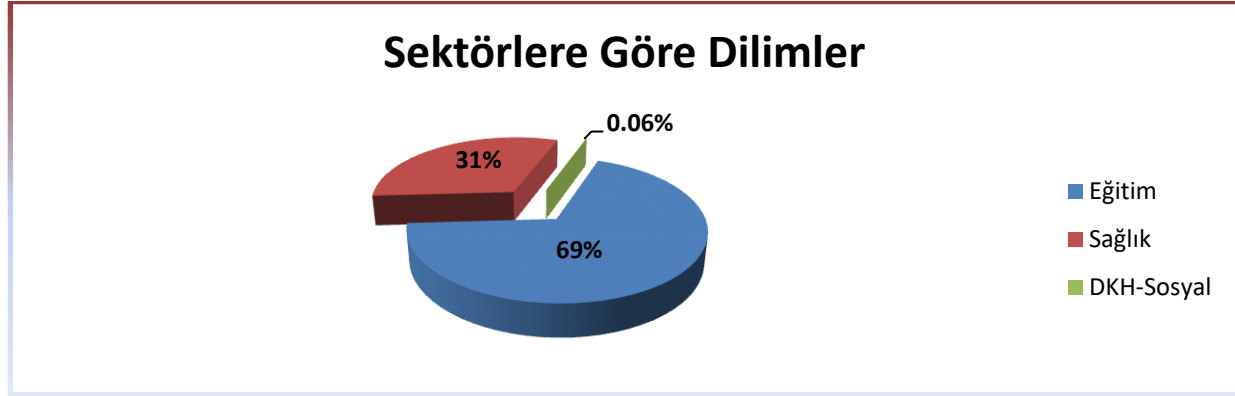


Şekil 1

Tablo 4: 2020 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı

Sektör	Proje No	Proje Ad	2020 Yılı Başlangıç Ödenegi (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2020H03-150967	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000	300.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	5.896.000	5.896.000
	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	4.000	4.000
	2020H03-150977	Muhtelif İşler	5.400.000	5.400.000
	2020H03-150972	Yayın Alımı	400.000	400.000
Sağlık Sektörü	2013I00-1846	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Mak. Teçhizat	4.500.000	4.500.000
	2020I00-152412	Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	1.000.000	1.000.000
DKH Sosyal Sektörü	2018K12-30857	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı	10.000	10.000
Toplam			17.510.000	17.510.000

Tablo 5: 2020 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	4.460.000	3.888.500	3.774.245
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000	637.742	527.419
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	9.700.000	16.821.757	16.818.668
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	700.000	1.405.000	1.389.898
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.300.000	2.125.000	1.798.621

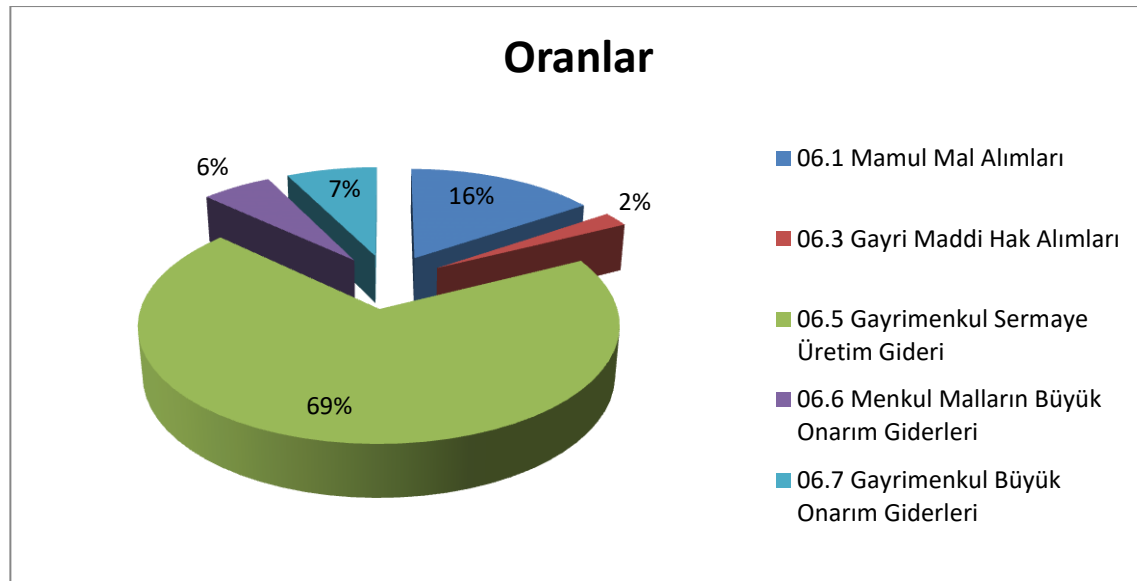Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı

1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2020 yılı itibarıyla Üniversitemiz bünyesinde toplam 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 4 Enstitü ve 19 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2020 yılında 914 akademik, 425 idari personel ve diğer personel olarak toplamda ise 2031 personelimiz bulunmaktadır. 2020 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %3 artış idari personel sayısı ise %2 oranında artış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2018, 2019 ve 2020 yıllarına ait personel bilgileri ve 2020 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

Tablo 6: 2018, 2019 ve 2020 Yılları Personel Sayıları

Personel Çeşidi	2018	2019	2020	2020 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	848	888	914	3
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	13	13	12	-8
İdari Personel	416	417	425	2
Sözleşmeli Personel	165	174	213	22
Sürekli İşçi	346	370	467	26
Toplam	1788	1862	2031	9


Tablo 7: 2018-2019 ve 2020 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları

Hizmet Sınıfı	2018 TOPLAM	2019 TOPLAM	2020 TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	203	208	216
Teknik Hizmetler	64	63	63
Sağlık Hizmetleri	130	126	124
Avukatlık Hizmetleri	2	2	3
Yardımcı Hizmetler	15	16	17
Diğer Hizmetler	2	2	2
Toplam	416	417	425

Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2020 yılında 425 idari personelimiz bulunmaktadır.

Tablo 8: 2018-2019 ve 2020 Yılları Akademik Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2018	2019	2020	2020 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	42	45	57	26
Doçent	51	54	69	27
Dr. Öğr. Üyesi	288	289	267	-8
Öğretim Görevlisi	215	249	265	6
Araştırma Görevlisi	252	251	256	2
Toplam	848	888	914	3

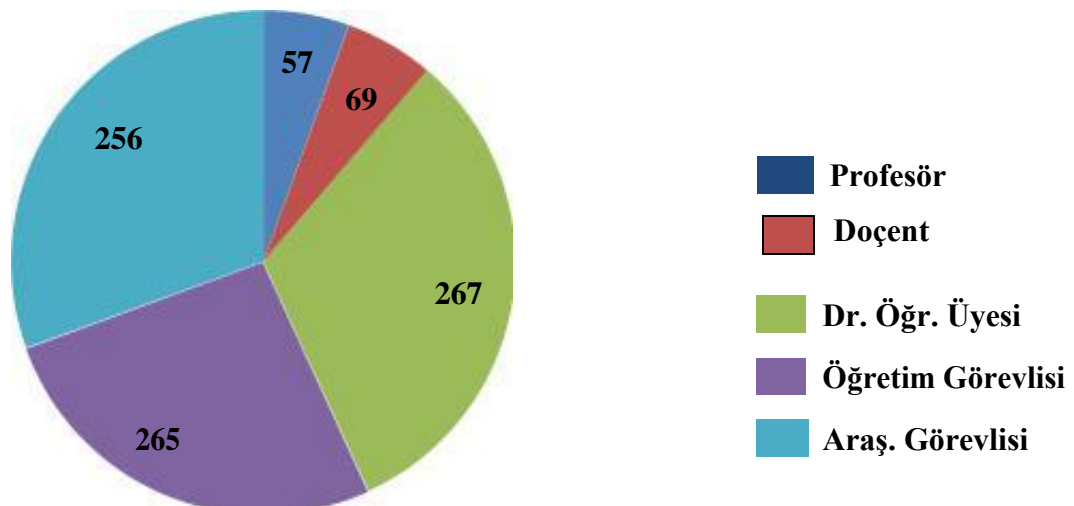

1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

1.5.2.1 Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.709.943,42 m² açık alana ve toplam 348.344 m² kapalı alana sahiptir. Kurumun 2020 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2020 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.709.943,42 m ²
Toplam Kapalı Alan	315.944 m ²
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	216.319 m ²
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	10.440 m ²
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	49.761 m ²
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m ²
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	8.100 m ²
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	15.501 m ²
Kapalı Spor Tesisleri	7.403 m ²
Diğer	2.344 m ²

Tablo 9: 2020 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları

Kapasite	0-50	51-75	76-100	101-150	151-250	Toplam
	(Kişi)	(Kişi)	(Kişi)	(Kişi)	(Kişi)	
Amfi	53	15	18	2	0	88
Sınıf	193	70	37	15	1	316
Bilgisayar Laboratuvarları	31	1	0	0	2	34
Diğer Laboratuvarlar	150	6	2	0	0	158
Atölye	0	0	0	0	0	0
Toplam	427	92	57	17	3	596

Tablo 10: 2020 Yılı Misafirhane Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Lojman	1	680
Uygulama Oteli	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m² kapalı alan sahip misafirhane ile Yozgat Merkezde 2.160 m² kapalı alana sahip Uygulama Oteli hizmetine devam etmektedir.



Tablo 11: 2020 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Merkezi Yemekhane Binası	1	6.782

Tablo 12: Sosyal Alanlar

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Merkezi Kütüphane Binası	1	6.076
Kapalı Spor Salonu	1	4.078
Kapalı Halı Saha	1	2.140
Kapalı Tenis Kortu	1	1.090
Futbol Sahası	1	9.600
Toplam	5	22.984

Tablo 13: Toplantı – Konferans Salonları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Kongre ve Kültür Merkezi	1	8.100
Toplam	1	8.100

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



Tablo 14: Hizmet Alanları

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Toplam	2	10.440

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda hizmet vermektedir.

Tablo 15: Taşıt Bilgileri

Taşıtın Cinsi	2018	2019	2020
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	13	13	12
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
Toplam	31	31	30

Tablo 16: Kütüphane Kaynakları

	2020 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	--	100	100	44.525	271.365	315.890
Dergi Aboneliği Sayısı	--	---	---	---	6.0237	60.237

Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	--	11	11	---	55	55
Yazma Eser Sayısı	--	---	---	---	---	---
Toplam	-	111	111	44.525	331.657	376.182

2020 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; doğrudan temin yöntemiyle (22/a usulü ile) alınmıştır.

1.6 HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo 17: 2020 Yılı Yatırımlarımız

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2020 Yılı Hedef	2020 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	Üniversitemiz kampüs alanında altyapı, çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.	Batı Yerleşkesi Elektrik Altyapı İş, Aydınlatma ve Kaldırım Yapım İş, Sulama Sistemleri Yapım İş, Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İş, Kaz Çiftliği Restorasyon Yapım İş, Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Nizamiye Giriş Kapısı Çevre Düzenleme İşleri için ihaleleri yapılarak işler tamamlanmış olup geçici kabulleri yapılmıştır.
Eğitim	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası İnşaatı yapım işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşme %75 leredir. İş bitim tarihi 29.03.2021'dir. Ayrıca Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin tarafından Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Nizamiye Giriş Kapısı hibe olarak yaptırılmış ve teslim alınmıştır.
Eğitim	2020H03-150967	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Sulama Sistemleri Yapım İş Projesi, Peyzaj Düzenleme Yapım İş Projesi, Ticarethane ve Konukevi Yapım İş için projeler hazırlanmıştır.
Eğitim	2020H03-150977	Muhtelif İşler	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda bakım-onarım ve makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kullanımda olan yapılarda bakım onarım ve tadilatlar yapılmıştır.
Eğitim	2020H03-150972	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.
Sağlık	2013I00-1846	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makina Tec.	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı 2018 de tamamlanmıştır. Hak ediş ödemeleri devam etmektedir. Makine teçhizat alımları ve çeşitli ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmiştir.	Yapımı biten binanın fiziki gerçekleşmesi %100 seviyelerine ulaştırılmıştır. Hak ediş ödemesi olarak en son mukayeseli hak ediş olan 34-EK-4 hak ediş ödemesi yapılmıştır. Makina teçhizat alımları halen devam etmektedir.

Sağlık	2020I00-152412	Muhtelif İşler	Hali hazırda faaliyet gösteren hastanenin ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.	Hastanenin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
DKH SOSYAL	2018K12-30857	Teknolojik Araştırma	Proje sonucunda, araştırma merkezimiz toksikoloji başta olmak üzere sağlık alanında bölgesel ve ulusal alandaki çeşitli problemleri, özellikle son dönemde gerçekleşen zehirlenme vakalarının tespiti ve çözümü konusunda alternatif olacak ve büyük fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, kurumumuz akredite olacak ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda geçerliliği artacaktır. Ayrıca Üniversitemizin Endüstriyel Kenevir alanındaki misyon farklılaşması kapsamında gerçekleştirilecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek verecektir. Sonuç olarak kurumumuz marka haline gelecek ve uluslararası standartlara sahip laboratuvar olacaktır.	Proje kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiş, personel eğitimleri ve cihaz validasyon çalışmalarında ilerleme kaydedilmiştir. Ancak 2019 ve 2020 yıllarında proje iz bedeli devam etmiş olması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yeterli ödenek tahsisi olmadığından projenin tamamlanması 2021 yılına kalmıştır. İstenilen bütçe ve insan kaynaklarının sağlanamaması durumunda projenin sonuçlanması zaman alacaktır.

2020 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler aşağıdaki şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Batı Kampüsü Elektrik Altyapı İşİ	Yapımı Tamamlandı.
Kaldırım ve Aydınlatma Yapım İşİ	Yapımı Tamamlandı.
Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Nizamiye Giriş Kapısı Çevre Düzenleme İşİ	Yapımı Tamamlandı.
Sulama Sistemleri Yapım İşİ	Yapımı Tamamlandı.
Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İşİ	Yapımı Tamamlandı.
Kaz Çiftliği Kaz Çiftliği Restorasyon Yapım İşİ	Yapımı Tamamlandı.

2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2020 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H03-921 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2020H03-150967 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2020H03-150972 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2020H03-150977 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2013I00-1846 proje numaralı Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makina-Teçhizat Alımı ve 2020I00-152412 proje numaralı Muhtelif İşler projesi olmak üzere 2, ve DKH Sosyal-Teknolojik

Araştırma Sektöründe Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve İlave Alt Yapı Projesi olmak üzere toplam 8 projenin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2020 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 17.510.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 24.878.000,00 TL'ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 24.308.854,00 TL'si harcanarak başlangıç ödeneğine göre %138,82 yılsonu ödeneğine göre ise %97,71 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo18: 2020 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	5.896.000	5.463.255	5.463.255	100
2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	4.000	6.367.771	6.367.771	100
2020H03-150967	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000	202.731	199.715	98
2020H03-150977	Muhtelif İşler	5.400.000	4.306.242	4.100.092	95
2020H03-150972	Yayın Alımı	400.000	640.000	624.256	97
2013I00-1846	Hastane İnşaatı ve Makine Tech. Alımı	4.500.000	5.788.000	5.787.759	100
2020I00-152412	Muhtelif İşler (Döner Sermaye ile)	1.000.000	2.100.000	1.760.811	83
2018K12-30857	Merkezi Araştırma Lab. – İlave Alt Yapı	10.000	10.000	5.192	52
Genel Toplam		17.510.000	24.878.000	24.308.854	97

2.1 2020 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Kampüs Altyapısı
NUMARASI	2020H03-151810
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020 - 2022
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100

Bu proje kapsamında 2020 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ Sulama Sistemleri Yapım İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu ve Bilal Şahin Batı Yerleşkelerini kapsayacak ve bu alanlarının sulama ihtiyaçlarının karşılamak üzere Sulama Sistemleri Yapım İşi ihalesi yapılarak geçici kabulü yapılmıştır.



√ Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu Yerleşkesi içerisinde yer alan doğal gölet etrafına yürüyüş yolu yapılarak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.



√ Batı Yerleşkesi Bilal Şahin Batı Nizamiye Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesinin Nizamiye Giriş Kapısı Hayırsever İş insanı Bilal ŞAHİN tarafından hibe olarak yaptırılmıştır. Çevre düzenleme ve ışıklandırma işi ise Üniversitemiz tarafından yaptırılarak teslim alınmıştır.



√ Kaldırım ve Aydınlatma Yapım İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesi içerisinde yer alan hastane yan yolunun ışıklandırması ve bu yolu kullanan öğrenci, personel ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için aydınlatma ve kaldırım yapım işi yapılmıştır.





√ Batı Kampüsü Elektrik Alt Yapı İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesi içerisinde yer alan hastane yan yolunun ışıklandırması ve bu yolu kullanan öğrenci, personel ve vatandaşların daha rahat ulaşım sağlamaları için aydınlatma ve kaldırım yapım işi yapılmıştır.



2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Derslik ve Merkezi Birimler					
NUMARASI	2008H03-921					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 - 2020					
KARAKTERİSTİĞİ	BESYO Binası (Spor Bilimleri Fak.) Yapım İşi					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam (TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
TOPLAM	19.986.000	14.174.000	4.000	6.367.771	6.367.771	100

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2008H03-921 proje nu-maralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin başlangıç ödeneği 4.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 6.367.771 TL’dir, tamamı harcanarak %100 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

√ **Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu Eğitim Binası Yapım İşi (Spor Bilimleri Fakültesi)**

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ihalesi yapılarak iş yeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. 10.000 m² alana sahip olacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binasının 2021 yılı itibarıyla fiziki gerçekleşmesi %75 civarındadır. İlgili proje için süre uzatımı verilmiş olup yeni iş bitim tarihi 28.03.2021 tarihidir.



2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi

Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi					
NUMARASI	2020H03-150967					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2020					
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2020	300.000	200.000	300.000	202.731	199.715	98

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2020H03-150967 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 202.731 TL’dir. 199.715 TL harcama yapılmış ve gerçekleşme yüzdesi %98 olmuştur.

2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif İşler					
NUMARASI	2020H03-150977					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2020					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2020	5.400.000	4.100.089	5.400.000	4.306.242	4.100.089	95

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2020H03-150977 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 5.400.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 4.306.242 TL’dir, 4.100.089 TL’si harcanarak %95 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
6.1	Mamul Mal Alımları	3.050.000	2.238.500	2.144.963
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	350.000	637.742	527.419
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	0	155.000	153.230
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	1.275.000	1.274.477
	Toplam	5.400.000	4.306.242	4.100.089

2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi

Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 400.000 TL kaynak öngörülmüş olup, yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 640.000 TL'ye ulaşmıştır. Bu tutarın 624.256,56 TL'si harcanmıştır.



2.1.6 Hastane İnşaatı Yatırım Projesi

Tablo 24: Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makine Teçhizat					
NUMARASI	2013I00-1846					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2013-2020					
KARAKTERİSTİĞİ	Hastane İnşaatı (46.635 m ²) (200 yatak), Makine-Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2020	120.234.000	115.734.000	4.500.000	5.788.000	5.787.759	99,99

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2013I00-1846 proje numaralı “Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı” projesinin başlangıç ödeneği 4.500.000 TL'dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 5.788.000 TL'ye ulaşmıştır. 5.787.759 TL'si harcanarak %99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 25: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif işler					
NUMARASI	2020I00-152412					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020-2020					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım onarım-Makina Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2020	1.000.000	1.760.811	1.000.000	2.100.000	1.760.811	83

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2020I00-152412 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 1.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 2.100.000 TL’ye ulaşmıştır.1.760.811 harcanarak %83 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 26: DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma- Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı					
NUMARASI	2018K12-30857					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018-2020					
KARAKTERİSTİĞİ	Teknolojik Araştırma -Makina Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği Dış Toplam(TL)	Revize Ödenek Dış Toplam (TL)	Harcama Dış Toplam(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2020	1.284.000	1.274.000	10.000	10.000	5.192	51,92

Üniversitemiz 2020 Yatırım Programında yer alan 2018K12-30857 proje numaralı “Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı” projesinin başlangıç ödeneği 10.000 TL’dir. 5.192 TL harcanarak % 51,92’lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

3. ÖNERİLER

Üniversitemiz kampüs çalışmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleşme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda verilmesi ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vizelenmesi yatırımların kısa sürede gerçekleşmesinde katkı sağlayacaktır.
