

YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

**Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı**

**2022 Yılı Yatırım Değerlendirme
Raporu**

Mart 2023

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	4
GENEL DEĞERLENDİRME	5
MİSYON – VİZYON	5
FAALİYET ALANLARI	6
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	13
ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	16
2022 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI	17
ÖNERİLER	23

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1	2022 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 2	2022 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 3	2022 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4	2022 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	7
Tablo 5	2022 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	7
Tablo 6	2020, 2021 ve 2022 Yılları Personel Sayıları	8
Tablo 7	2020, 2021 ve 2022 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	9
Tablo 8	2020, 2021 ve 2022 Yılları Akademik Personel Sayıları	9
Tablo 9	2022 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	10
Tablo 10	2022 Yılı Misafirhane Bilgileri	11
Tablo 11	2022 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	11
Tablo 12	Sosyal Alanlar	11
Tablo 13	Toplantı – Konferans Salonları	12
Tablo 14	Hizmet Alanları	12
Tablo 15	Taşıt Bilgileri	12
Tablo 16	Kütüphane Kaynakları	13
Tablo 17	2022 Yılı Yatırımlarımız	13
Tablo 18	2022 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	16
Tablo 19	Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	17
Tablo 20	Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	18
Tablo 21	Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 22	Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 23	Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödenegi Revize Ödenek ve Harcama	20
Tablo 24	Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	21
Tablo 25	DKH-Sosyal Sektörü-İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	22

YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2022 yılında toplam 29.700.000TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde ek bütçe, eklemeler ve düşmeler ile birlikte 59.292.776TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2022 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2022 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON-VİZYON



MİSYON

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

VİZYON

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.



1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

1.3 TEMEL AMAÇLAR

Amaç- 1 Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

Amaç- 2 Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini artırmak

Amaç- 3 Üniversite içinde yenilikçi ve girişimci bir atmosfer geliştirmek

Amaç- 4 Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırmak

Amaç- 5 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2022 Yılı Yatırım Programında toplam 7 adet proje için 59.292.776 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar yılsonu toplam 33.672.930 TL olarak gerçekleşmiştir.

2022 yılında 49.700.000 TL ödenek hazine yardımı olarak verilmiştir. 9.592.776 TL ise likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 36.968.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık sektörüne 14.739.000 TL ve DKH Sosyal sektörüne de 7.585.776 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2022 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
13.700.000	36.968.000	22.110.828	%161	%59


Tablo 2: 2022 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
14.000.000	14.739.000	8.791.357	%62	%59

Tablo 3: 2022 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
2.000.000	7.585.776	2.770.745	%138	%36

Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı

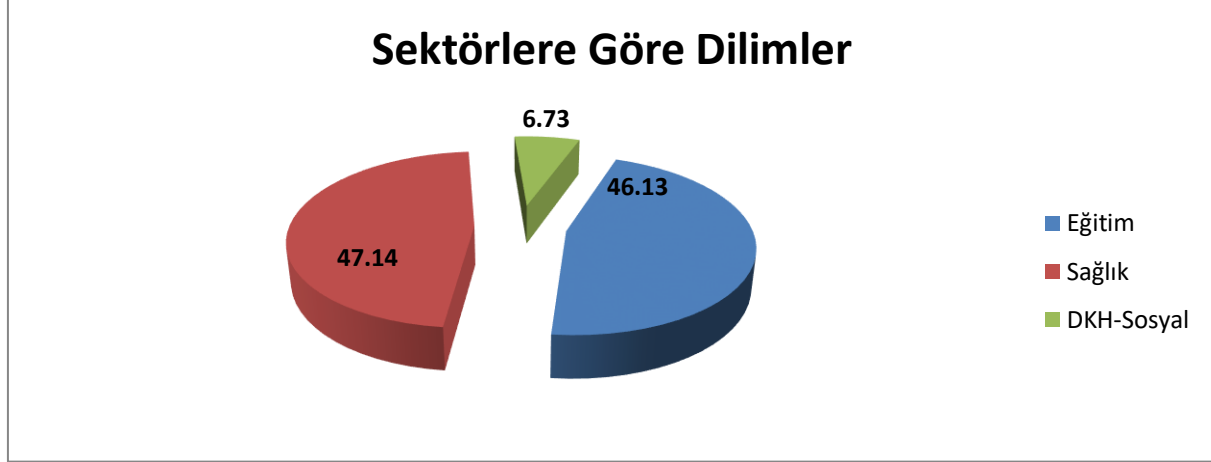

Şekil 1


Tablo 4: 2022 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı

Sektör	Proje No	Proje Ad	2022 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2022H03-187059	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	5.500.000	5.500.000
	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	1.000.000	1.000.000
	2022H03-186808	Muhtelif İşler	6.000.000	6.000.000
	2022H03-186802	Yayın Alımı	1.000.000	1.000.000
Sağlık Sektörü	2022I00-178940	Sağlık Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	14.000.000	14.000.000
DKH Sosyal Sektörü	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	2.000.000	2.000.000
Toplam			29.700.000	29.700.000

Tablo 5: 2022 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	15.000.000	25.969.256	17.518.662
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000	1.444.000	1.293.792
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	6.700.000	17.580.500	5.628.159
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	3.300.000	3.600.000	2.316.964
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.700.000	10.700.000	6.915.350

Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı

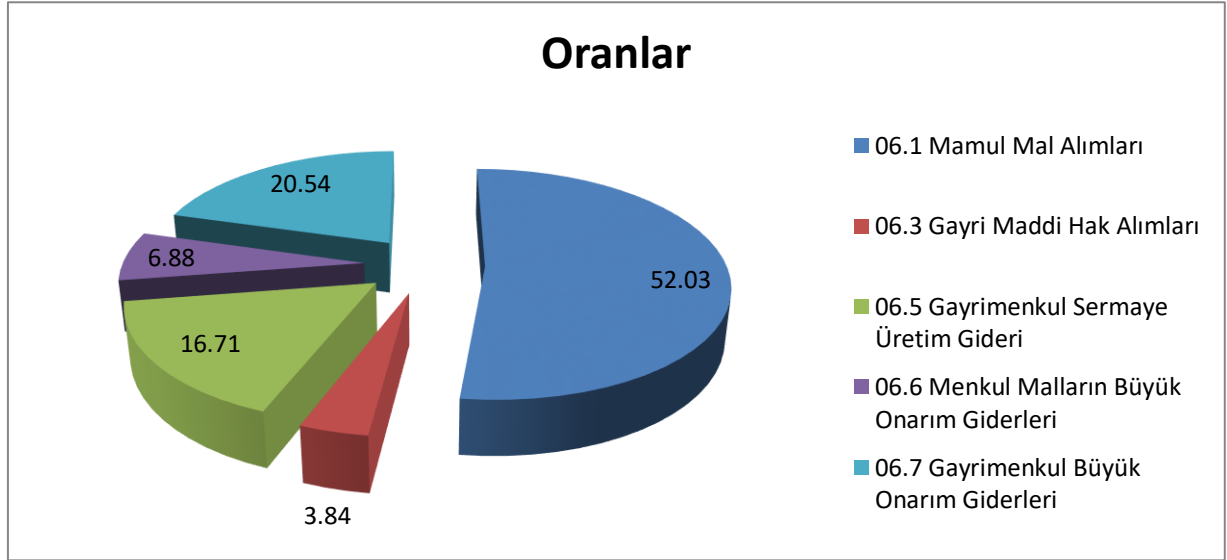

1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2022 yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde toplam 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 2 Enstitü ve 20 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2022 yılında 935 akademik personel, 9 yabancı uyruklu akademik personel, 414 idari personel, 289 sözleşmeli personel ve 453 sürekli işçi olmak üzere toplamda 2100 personelimiz bulunmaktadır. 2022 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı % 0,63, idari personel sayısı ise %2.12 oranında azalış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2020, 2021 ve 2022 yıllarına ait personel bilgileri ve 2022 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

Tablo6: 2020, 2021 ve 2022 Yılları Personel Sayıları

Personel Çeşidi	2020	2021	2022	2022 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	914	941	935	-% 0,63
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	12	9	9	% 0
İdari Personel	425	423	414	-% 2,12
Sözleşmeli Personel	213	247	289	% 17
Sürekli İşçi	467	462	453	-% 1,94
Toplam	2031	2082	2100	%0,86

Tablo 7: 2020-2021 ve 2022 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları

Hizmet Sınıfı	2020	2021	2022
Genel İdari Hizmetler	216	213	214
Teknik Hizmetler	63	67	63
Sağlık Hizmetleri	124	118	112
Avukatlık Hizmetleri	3	3	3
Yardımcı Hizmetler	17	20	20
Diğer Hizmetler	2	2	2
Toplam	425	423	414

Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2022 yılında 414 idari personelimiz bulunmaktadır.

Tablo 8: 2020-2021 ve 2022 Yılları Akademik Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2020	2021	2022	2022 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	57	64	69	%7,81
Doçent	69	109	109	%0
Dr. Öğr. Üyesi	267	242	265	%9,5
Öğretim Görevlisi	265	274	278	%1,45
Araştırma Görevlisi	256	252	214	-%15,07
Toplam	914	941	935	-%0,63

1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

1.5.2.1 Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.716.322,53 m² açık alana ve toplam 321.838 m² kapalı alana sahiptir. Kurumun 2022 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2022 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.716.322,53 m ²
Toplam Kapalı Alan	321.838m ²
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	228.111 m ²
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	11.812 m ²
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	41.486 m ²
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m ²
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	9.200 m ²
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	15.501 m ²
Kapalı Spor Tesisleri	7.308 m ²
Diğer	2.344 m ²

Tablo 9: 2022 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları

Eğitim Alanı	Amfi	Sınıf(Adet)	Bilgisayar Lab. (Adet)	Diğer Lab. (Adet)	Toplam Adet
0-50 Kişilik	53	191	33	173	450
51-75 Kişilik	15	80	1	8	104
76-100 Kişilik	13	45	0	2	60
101-150 Kişilik	3	7	0	0	10
151-250 Kişilik	0	1	0	0	1
251-Üzeri Kişilik	0	0	2	0	2
Toplam	84	324	36	183	627

Tablo 10: 2022 Yılı Misafirhane Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Lojman	1	680
Uygulama Oteli	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m² kapalı alan sahip misafirhane ve Yozgat Merkezde 2.160 m² kapalı alana sahip Uygulama Oteli ile hizmetine devam etmektedir.

**Tablo 11: 2022 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Merkezi Yemekhane Binası	1	6.782

Tablo 12: Sosyal Alanlar

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Merkezi Kütüphane Binası	1	6.076
Kapalı Spor Salonu	1	4.078
Kapalı Halı Saha	1	2.140
Kapalı Tenis Kortu	1	1.090
Futbol Sahası	1	9.600
Toplam	5	22.984

Tablo 13: Toplantı – Konferans Salonları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Kongre ve Kültür Merkezi	1	8.100
Toplam	1	8.100

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



Tablo 14: Hizmet Alanları

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Toplam	2	10.440

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda idari hizmetler vermektedir.

Tablo 15: Taşıt Bilgileri

Taşıtın Cinsi	2020	2021	2022
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	12	12	12
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
Toplam	30	30	30

Tablo 16: Kütüphane Kaynakları

	2022 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	0	2.160.943	2.160.943	77.546	2.163.857	2.241.403
Dergi Aboneliği Sayısı	-	209.620	209.620	-	209.620	209.620
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	18	18	-	65	65
Toplam	0	2.370.581	2.370.581	77.546	2.373.542	2.451.088

2022 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; yıllık abonelik yöntemiyle temin edilmiştir.

1.6 HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo 17: 2022 Yılı Yatırımlarımız

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2022 Yılı Hedef	2021 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	Üniversitemiz kampüs alanında çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.	Akdağmadeni ve Şefaati MYO'nun doğalgaz dönüşümü ve MMF OG Hattının galeri içerisine alınması ihaleleri yapılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz ve bağlı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda alt yapı işleri yapılmıştır.
Eğitim	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	Kenevir Enstitüsü Lab. Binası İkmal İnşaatı	2022 yılı içerisinde ihalesi yapılmış ancak yıl içinde fiyatlardaki olağanüstü artış nedeni ile ihaleye katılım olmamıştır. 2023 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmaktadır
			Ticarethane ve Konukevi Projesi	2022 yılı içerisinde oluşan fiyat artışları nedeni ile bağışçı tarafından projenin ertelenmesi istenilmiş (sözlü) ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanmıştır
Eğitim	2022H03-187059	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Diş Hekimliği Fakültesi, Sarıkaya Fizik Tedavi Reh. Y.O. Teras, Kenevir Enstitüsü Hangar ve MMF Kazan projeleri hazırlanmıştır.

Eğitim	2022H03-186808	Muhtelif İşler	<p>Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda mefruşat, laboratuvar malzemesi, bilişim malzemesi, makine teçhizatları ve bakım-onarım taleplerinin karşılanması hedeflenmiştir. Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesi (BESYO) binasının inşaatının kesin hesabı bu projede takip edilmektedir.</p>	<p>Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda Büyük Onarım İhalesine çıkılmış ve bu çerçevede bakım onarım tadilat işleri yapılmıştır. İşin geçicikabulü yapılarak işler teslim alınmıştır. Ayrıca Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda tadilat ve onarım işleri yapılmıştır Sarıkaya Fizik Tedavi Reh. Y.O. bakım-onarım ihalesi yapılarak geçici kabulü yapılmıştır. Yine Üniversitemiz birimlerinin talepleri doğrultusunda bilişim malzemesi, laboratuvar malzemesi ve mefruşat malzemesi ihtiyaçları karşılanmıştır. Spor Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı yapım işi 2022 yılı içerisinde %80 seviyelerine gelmiş ancak yükleniciden kaynaklı nedenlerden dolayı sözleşmesi fesih edilmiştir.</p>
Eğitim	2022H03-186802	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.	Elektronik veri tabanı alımı yapılmıştır.
Sağlık	2022I00-178940	Muhtelif İşler	<p>Hastanemizin teknik ve teknolojik bakımdan faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilen, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan sağlık sunucu olarak varlığını devam ettirmesi hedeflenmektedir.</p>	<p>Hastanemizde faaliyet gösteren bölümler için yeni tıbbi cihaz ihtiyaçları giderilerek hizmet kalitesi artırılmıştır. Aynı zamanda faaliyetlerine devam eden bölümlerde aktif kullanılan tıbbi cihazların bakım onarımları yaptırılmış etkin ve doğru sonuçlar alınması sağlanmıştır. Hastanemizin ısıtma, soğutma sistemleri düzenli aralıklarla kontrolleri yaptırılarak hizmetin aksamadan sunulmasına olanak sağlanmıştır. Hastalarımız ve personelimiz için sunulan yemek hizmetleri üretim alanı hastanemiz içerisine alınmıştır.</p>
DKH SOSYAL	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi	<p>1) Endüstriyel Kenevir Projesi kapsamında 2022 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri için planlanan ihale, tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yapılamamıştır.</p> <p>2) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Enstitü</p>	

		<p>bünyesinde 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre; 3 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görevlendirilmiş olup toplam 10 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma Görevlisi ve 2 İdari Personel görev yapmaktadır.</p> <p>3) Kenevir esaslı projeler için Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı 7.585.776,00 TL'lik makine teçhizat ve onarım başlıklarında destek vermiştir. Bu desteğin 2.770.745,09 TL'lik kısmı yürüyen Ar-Ge projelerine makine teçhizat ve laboratuvar malzemesi alımında kullanılmıştır. Kenevir araştırmaları için planlanan hangar yapımı için ihaleye çıkılmış ancak sonuç alınamamıştır.</p> <p>4) 2022 yılında BAP birimi tarafından kenevirle ilgili 48 adet toplam 2.176.481,86 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bunların 2.011.449,65 TL bütçeli 43 adet projeye ait destek devam etmekte ve kenevir alanıyla ilgili proje kabulleri de devam etmektedir.</p> <p>5) Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 1 Adet KOP Projesi, 1 adet TÜBİTAK Projesi devam etmektedir.</p> <p>Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu protokol uyarınca MESA Holding tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde 5 Ünitelerden oluşan bir Sera Kompleksi yapımı devam etmekte olup %90 oranında tamamlanmıştır.</p>
--	--	--

2022 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler aşağıdaki şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Şefaatli Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi	Tamamlandı
Akdağmadeni Meslek Yüksekokulu Doğalgaz Dönüşüm İşi	Tamamlandı
Büyük Bakım Onarım İşi	Tamamlandı
MMF OG Hattının Galeri İçerisine Alınması ve Altyapı İşleri	Tamamlandı
Sarıkkaya Fizik Tedavi Reh. Yüksekokulu Tadilat ve Onarım İşleri	Tamamlandı
MMF Kazan Değişim İşi	Sözleşme imzalandı.

2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2022 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H03-921 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2022H03-187059 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2022H03-186802 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2022H03-186808 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2022I00-178940 proje numaralı Muhtelif İşler projesi ve DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 2021K12-169144 proje numaralı İhtisaslaşma Projesi olmak üzere toplam 7 projenin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2022 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 29.700.000 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 59.292.776 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 33.672.930 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre %113,37 yılsonu ödeneğine göre ise %56,79 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo18: 2022 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödenegi (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	5.500.000	6.414.500	5.428.857	84
2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	1.000.000	6.811.000	0	0
2022H03-187059	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000	199.302	99
2022H03-186808	Muhtelif İşler (Eğitim)	6.000.000	22.712.500	15.682.592	69
2022H03-186802	Yayın Alımı	1.000.000	830.000	800.076	96
2022I00-178940	Muhtelif İşler (Sağlık)	14.000.000	14.739.000	8.791.357	59
2021K12-16944	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	2.000.000	7.585.776	2.770.745	36
Genel Toplam		29.700.000	59.292.776	33.672.930	56

2.1 2022 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ADI	Kampüs Altyapısı
NUMARASI	2020H03-151810
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020 - 2022
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, KanalizasyonHattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı


YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100
2021	13.480.000	1.825.843	-	4.000.000		1.980.000		1.825.843	92
2022	13.480.000	5.428.857		5.500.000		6.414.500		5.428.857	84

Bu proje kapsamında2022 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ Şefaattli ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulları Doğalgaz Dönüşüm İşleri

Üniversitemiz Şefaattli ve Akdağmadeni Meslek Yüksekokulları Doğalgaz dönüşüm ihaleleri yaptırılmış ve işlerin geçici kabulleri yapılmıştır.

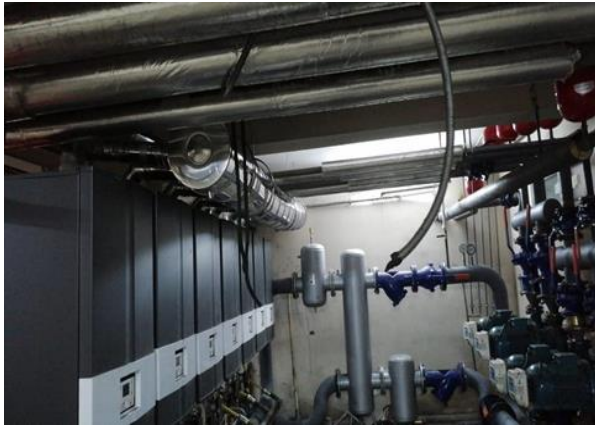

√ MMF OG Hattının İçeri Alınması ve Altyapı İşleri

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesi içerisinde yer alan Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi binası Orta Gerilim hattı (OG) galeri içerisine alınmıştır.



2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN ADI	Derslik ve Merkezi Birimler								
NUMARASI	2008H03-921								
YERİ	Yozgat								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 - 2023								
KARAKTERİSTİĞİ	Kenevir Arş. Enstitüsü ve Laboratuvarı Komp. İkmal İnşaatı, Ticarethane ve Konukevi								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	11.000.000	-		1.000.000		6.811.000		0	0

Üniversitemiz 2022 Yatırım Programında yer alan 2008H03-921 proje numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin başlangıç ödeneği 1.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 6.811.000 TL olup, harcama yapılmamıştır.

√ Kenevir Arş. Enstitüsü ve Laboratuvar Kompleksi İkmal İnşaatı

Proje kapsamında kullanılmayan Çarşı Binası için projeler hazırlanmış ve 2022 yılı içerisinde ihaleye çıkılarak Kenevir Enstitüsü Laboratuvar Binası yapılması planlanmış ancak ihale gerçekleştirilememiştir. 2023 yılı içerisinde ihalesinin yapılması planlanmıştır.

√ **Ticarethane ve Konukevi**

Üniversitemiz için hayırsever İş İnsanı Bilal Şahin tarafından hibe olarak yaptırılması düşünülen Ticarethane ve Konukevi projesi 2022 yılı içerisinde oluşan fiyat artışları nedeni ile bağışçı tarafından projenin ertelenmesi istenilmiş (sözlü) ve 2023 yılında gerçekleşmesi planlanmıştır.

2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi**Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri**

SEKTÖR		Eğitim							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü							
PROJENİN ADI		Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi							
NUMARASI		2022H03-187059							
YERİ		Yozgat							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2022-2022							
KARAKTERİSTİĞİ		Etüt-Proje							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	200.000	200.000		200.000		200.000		199.302	99

Üniversitemiz 2022 Yatırım Programında yer alan 2022H03-187059 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 200.000 TL’dir. 199.302 TL harcama yapılmış ve gerçekleşme yüzdesi % 99 olmuştur.

2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi**Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri**

SEKTÖR		Eğitim							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü							
PROJENİN ADI		Muhtelif İşler							
NUMARASI		2022H03-186808							
YERİ		Yozgat							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2022-2022							
KARAKTERİSTİĞİ		Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	6.000.000	15.682.592		6.000.000		22.712.500		15.682.592	69

Üniversitemiz 2022 Yatırım Programında yer alan 2022H03-186808 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 6.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 22.712.500 TL’dir, 15.682.592 TL harcanarak %69 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
6.1	Mamul Mal Alımları	3.200.000	8.013.500	7.555.951
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	1.000.000	1.444.000	1.293.793
6.5	Gayri Menkul Sermaye Üretim Giderleri	0	4.155.000	0
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	800.000	1.100.000	1.092.288
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.000.000	8.000.000	5.740.560
	Toplam	6.000.000	22.712.500	15.682.592

√ Büyük Bakım Onarım İhalesi

Proje kapsamında Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler üzerine tadilat projeleri hazırlanarak Büyük Bakım Onarım İhalesine çıkılmış ve bakım onarım işleri yaptırılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır.

√ Sarıkaya Fizik Tedavi ve Reh. Y.O. Tadilat Onarım İşleri

Proje kapsamında Sarıkaya Fizik Tedavi ve Reh. Y.O. içerisinde tadilat ve onarım işleri yapılmıştır. İşin geçici kabulü yapılmıştır.



√ Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Binası Yapım İşi

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun ihalesi yapılarak iş yeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. 10.000 m² alana sahip olacak olan Spor Bilimleri Fakültesi (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu) Binasının 2022 yılı itibarıyla fiziki gerçekleşmesi %80 civarındadır. İlgili proje için süre uzatımı verilmiş ancak yükleniciden kaynaklı gecikmeler nedeni ile işin sözleşmesi 2022 yılı içerisinde fesih edilmiştir. 2023 yılı içerisinde yeniden ihaleye çıkılması planlanmaktadır.



2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi



Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 830.000 TL kaynak öngörülmüş olup, bu tutarın 800.076 TL'si harcanmıştır.

2.1.6 Sağlık Sektörü Yatırım Projesi

Tablo 24: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif işler					
NUMARASI	2022I00-178940					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2022-2022					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım-Makina Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2022	14.000.000	8.791.357	14.000.000	14.739.000	8.791.357	59

Üniversitemiz 2022 Yatırım Programında yer alan 2022I00-178940 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 14.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ve düşmeleri ile yılsonu revize ödeneği 14.739.000 TL olmuştur. 8.791.357 TL harcanarak % 59 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 25: DKH- İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
NUMARASI	2021K12-16944					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2025					
KARAKTERİSTİĞİ	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2022	15.000.000	-	2.000.000	7.585.776	2.770.745	36

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2021K12-16944 proje numaralı projesinin başlangıç ödeneği 2.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ile yılsonu revize ödeneği 7.585.776 TL olmuştur. 2.770.745 TL harcanarak % 36 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

√ **Tarım Alet ve Ekipman Alımı**

Üniversitemiz Kenevir Araştırmaları Enstitüsü bünyesine, endüstriyel kenevir alanında tarımsal araştırmalar için kullanılmak üzere tarım alet ve ekipmanları alınmıştır.



3. ÖNERİLER

Üniversitemiz, kampüs çalışmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemiz, kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleşme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda verilmesi ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vizelenmesi yatırımların kısa sürede gerçekleşmesinde katkı sağlayacaktır.
