

# YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

Strateji Geliştirme Daire  
Başkanlığı

2024 Yılı Yatırım Değerlendirme  
Raporu

Mart 2025



## İÇİNDEKİLER

<b>YÖNETİCİ ÖZETİ</b>	<b>4</b>
<b>GENEL DEĞERLENDİRME</b>	<b>5</b>
<b>MİSYON – VİZYON</b>	<b>5</b>
<b>FAALİYET ALANLARI</b>	<b>6</b>
<b>TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER</b>	<b>6</b>
<b>YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI</b>	<b>6</b>
<b>MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ</b>	<b>8</b>
<b>HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI</b>	<b>13</b>
<b>ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU</b>	<b>18</b>
<b>2024 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI</b>	<b>19</b>
<b>ÖNERİLER</b>	<b>28</b>

## TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1	2024 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 2	2024 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 3	2024 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4	2024 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	7
Tablo 5	2024 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	7
Tablo 6	2022, 2023 ve 2024 Yılları Personel Sayıları	8
Tablo 7	2022, 2023 ve 2024 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	9
Tablo 8	2022, 2023 ve 2024 Yılları Akademik Personel Sayıları	9
Tablo 9	2024 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	10
Tablo 10	2024 Yılı Misafirhane Bilgileri	10
Tablo 11	2024 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	11
Tablo 12	Sosyal Alanlar	11
Tablo 13	Toplantı – Konferans Salonları	11
Tablo 14	Hizmet Alanları	12
Tablo 15	Taşıt Bilgileri	12
Tablo 16	Kütüphane Kaynakları	12
Tablo 17	2024 Yılı Yatırımlarımız	13
Tablo 18	2024 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	18
Tablo 19	Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 20	Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 21	Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	21
Tablo 22	Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	22
Tablo 23	Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama	22
Tablo 24	Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	25
Tablo 25	Sağlık Sektörü-Hastane Ek Binası	27
Tablo 26	DKH-Sosyal Sektörü-İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	27

## YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2024 yılında toplam 121.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde ek bütçe, eklemeler ve düşmeler ile birlikte 157.422.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2024 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2024 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

**Prof. Dr. Evren YAŞAR**  
**Rektör**

## 1. GENEL DEĞERLENDİRME

### 1.1 MİSYON-VİZYON



#### *MİSYON*

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

#### *VİZYON*

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.



## 1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

## 1.3 TEMEL AMAÇLAR

Amaç- 1 Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

Amaç- 2 Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini artırmak

Amaç- 3 Üniversite içinde yenilikçi ve girişimci bir atmosfer geliştirmek

Amaç- 4 Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırmak

Amaç- 5 Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

## 1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2024 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje için 157.422.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar yılsonu toplam 131.589.219,03 TL olarak gerçekleşmiştir.

2024 yılında 125.000.000 TL ödenek hazine yardımı olarak verilmiştir. 32.422.000 TL ise likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 99.409.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık sektörüne 42.605.000 TL ve DKH Sosyal sektörüne de 15.408.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

**Tablo 1: 2024 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri**

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
70.000.000	99.409.000	87.402.169	%125	%88


**Tablo 2: 2024 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri**

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
36.500.000	42.605.000	28.783.167	%79	%67

Tablo 3: 2024 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
15.000.000	15.408.000	15.403.881	%103	%100

Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı

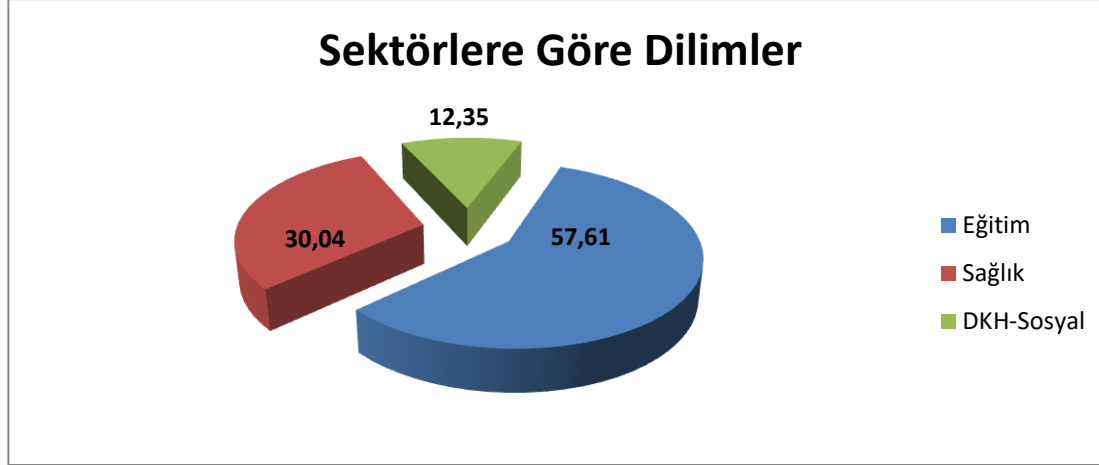

Tablo 4: 2024 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı


Sektör	Proje No	Proje Ad	2024 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2024H03-233156	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	20.000.000	20.000.000
	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000	2.000
	2024H03-233152	Muhtelif İşler	46.798.000	46.798.000
	2024H03-233154	Yayın Alımı	3.000.000	3.000.000
Sağlık Sektörü	2024I00-223507	Sağlık Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	23.200.000	23.200.000
	2024I00-223575	Hastane Ek Binası	13.300.000	13.300.000
DKH Sosyal Sektörü	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	15.000.000	15.000.000
<b>Toplam</b>			<b>121.500.000</b>	<b>121.500.000</b>

Tablo 5: 2024 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	56.397.000	74.086.000	72.035.994
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.000.000	2.465.000	2.454.346
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	36.103.000	32.702.000	19.441.052
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	8.000.000	8.300.000	8.216.396
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	19.000.000	39.869.000	29.441.428



Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı

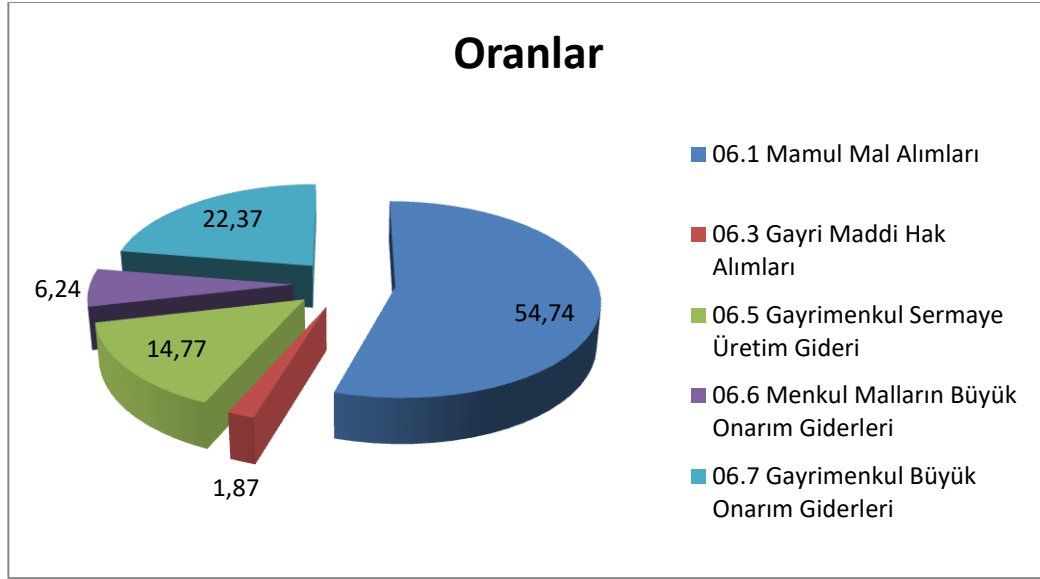

### 1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2024 yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde toplam 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 2 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 1 Teknopark, 1 Teknoloji- Transfer Ofisi, 2 Enstitü ve 20 Uygulama ve Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

#### 1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2024 yılında 959 akademik personel, 7 yabancı uyruklu akademik personel, 661 idari personel, 113 sözleşmeli personel ve 439 sürekli işçi olmak üzere toplamda 2179 personelimiz bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2022, 2023 ve 2024 yıllarına ait personel bilgileri ve 2024 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

**Tablo 6: 2022, 2023 ve 2024 Yılları Personel Sayıları**

Personel Çeşidi	2022	2023	2024	2024 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	935	936	959	% 2,45
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	9	9	7	-% 22,22
İdari Personel	414	689	661	-% 4,06
Sözleşmeli Personel	286	57	113	% 98,25
Sürekli İşçi	453	446	439	-% 1,02
<b>Toplam</b>	<b>2097</b>	<b>2137</b>	<b>2179</b>	<b>% 1,96</b>

**Tablo 7: 2022-2023 ve 2024 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları**

Hizmet Sınıfı	2022	2023	2024
Genel İdari Hizmetler	214	222	234
Teknik Hizmetler	63	65	63
Sağlık Hizmetleri	112	364	325
Avukatlık Hizmetleri	3	2	2
Yardımcı Hizmetler	20	34	35
Diğer Hizmetler	2	2	2
<b>Toplam</b>	<b>414</b>	<b>689</b>	<b>661</b>

**Tablo 8: 2022-2023 ve 2024 Yılları Akademik Personel Sayıları**

Personel Sınıfı	2022	2023	2024	2024 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	69	89	104	% 16,85
Doçent	109	131	145	% 10,69
Dr. Öğr. Üyesi	265	268	287	% 7,09
Öğretim Görevlisi	278	264	260	-% 1,52
Araştırma Görevlisi	214	184	163	-% 11,41
<b>Toplam</b>	<b>935</b>	<b>936</b>	<b>959</b>	<b>% 2,45</b>

## 1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

### 1.5.2.1: Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.716.322,53 m<sup>2</sup> açık alana ve toplam 321.917 m<sup>2</sup> kapalı alana sahiptir. Kurumun 2024 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2024 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.716.322,53 m <sup>2</sup>
Toplam Kapalı Alan	321.917 m <sup>2</sup>
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	230.909 m <sup>2</sup>
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	11.812 m <sup>2</sup>
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	41.486 m <sup>2</sup>
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m <sup>2</sup>
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	9.200 m <sup>2</sup>
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	12.782 m <sup>2</sup>
Kapalı Spor Tesisleri	7.308 m <sup>2</sup>
Diğer	2.344 m <sup>2</sup>

**Tablo 9: 2024 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları**

Eğitim Alanı	Amfi (Adet)	Sınıf(Adet)	Bilgisayar Lab. (Adet)	Diğer Lab. (Adet)	Toplam Adet
0-50 Kişilik	49	182	33	167	431
51-75 Kişilik	15	87	1	10	113
76-100 Kişilik	13	46		2	61
101-150 Kişilik	3	9			12
151-250 Kişilik		1			1
<b>Toplam</b>	<b>80</b>	<b>325</b>	<b>34</b>	<b>179</b>	<b>618</b>

**Tablo 10: 2024 Yılı Misafirhane Bilgileri**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Lojman</b>	1	680
<b>Uygulama Oteli</b>	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m<sup>2</sup> kapalı alan sahip misafirhane ve Yozgat Merkezde 2.160 m<sup>2</sup> kapalı alana sahip Uygulama Oteli ile hizmetine devam etmektedir.



**Tablo 11: 2024 Yılı Yemekhane Binası**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Merkezi Yemekhane Binası</b>	1	6.782

**Tablo 12: Sosyal Alanlar**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Merkezi Kütüphane Binası</b>	1	6.076
<b>Kapalı Spor Salonu</b>	1	4.078
<b>Kapalı Halı Saha</b>	1	2.140
<b>Kapalı Tenis Kortu</b>	1	1.090
<b>Futbol Sahası</b>	1	9.600
<b>Toplam</b>	<b>5</b>	<b>22.984</b>

**Tablo 13: Kongre Merkezi**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
<b>Kongre ve Kültür Merkezi</b>	1	8.100
<b>Toplam</b>	<b>1</b>	<b>8.100</b>

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



**Tablo 14: Hizmet Alanları**

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m <sup>2</sup> )
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1	1.372
<b>Toplam</b>	<b>3</b>	<b>11.812</b>

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı binası ve Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda idari hizmetler vermektedir.

**Tablo 15: Taşıt Bilgileri**

Taşıtın Cinsi	2022	2023	2024
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	12	14	14
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
<b>Toplam</b>	<b>30</b>	<b>32</b>	<b>32</b>

**Tablo 16: Kütüphane Kaynakları**

	2024 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	591	164.267	164.858	76.218	167.281	243.499
Dergi Aboneliği Sayısı	-	68.696	68.696	-	68.696	68.696
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	15	15	-	60	608
<b>Toplam</b>	<b>591</b>	<b>232.978</b>	<b>233.569</b>	<b>76.218</b>	<b>236.037</b>	<b>312.803</b>

2024 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; yıllık abonelik yöntemiyle temin edilmiştir.

## 1.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo 17: 2024 Yılı Yatırımlarımız

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2024 Yılı Hedef	2024 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	Led dönüşüm ve yangın ihbar santral yapım işi, kazan değişimi ve su deposu yapım işleri, temiz içme suyu hattı yapım işi, ihaleleri yapılması	Yıl içerisinde planlanan ihalelere çıkılmış olup, sözleşmeler imzalanmış ve işin yer teslimi yapılarak, işler tamamlanmış ve geçici kabulleri yapılmıştır. Ayrıca; Üniversitemiz ve bağlı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda alt yapı işleri yapılmıştır.
Eğitim	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	Kenevir Enstitüsü laboratuvar binası ikmal inşaatı yapılması	2024 yılı içerisinde işin kesin kabulü yapılarak tamamlanmıştır.
			Ticarethane ve konukevi projesi yapılması	2022 yılı içerisinde oluşan fiyat artışları nedeni ile başışçı tarafından projenin ertelenmesi (sözlü) istenilmiştir.
Eğitim	2024H03-233156	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması	Diş Hekimliği Fakültesi havalandırma ve medikal tesisat projesi alım işi, GES projesi proje tanıtım dosyası hazırlama işi, Bozok Evi doğalgaz proje revizyon işi ve yemekhane baca analizi ve doğalgaz projesi alım işleri gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2024H03-233152	Muhtelif İşler	Üniversitemiz Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirin projeler doğrultusunda;	
			1-Üniversitemiz birimlerindeki eksik olan fotokopi makinesi, yazıcı, güvenlik kamerası, access point (wifi) alımı	% 100 (1.348.875,32 TL'lik bilişim ürün alımı yapılmıştır)
			2-Üniversitemiz akademik ve idari personeli için bilgisayar yazıcı alımı	% 100 (995.972,26TL harcanarak bilgisayar alımı tamamlanmıştır)
			3- Akdağmadeni Sağlık Yüksekokulu laboratuvar kurulumu	% 100 (1.999.589,77 TL harcanarak bilgisayar alımı tamamlanmıştır)
			4-Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim malzemesi (klavye, mouse, ssd, webcam, ram, toner, vb. alımı	% 100 (817.938,00 TL donanım/tüketim malzeme alımı yapılmıştır)
			5-Daire başkanlıkların kullanmış oldukları web otomasyon sistem alımı	% 100 (2.454.346,28TL)
			6-Sorgun Meslek Yüksekokulu laboratuvar kurulumu	%100 (875.060,00 TL'lik bilgisayar alınarak donatılmıştır)
			Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından İse;	

1- Kongre ve Kültür Merkezi binası için hava perdesi alımı	%100 ( 192.000,00 TL harcanarak Kongre ve Kültür Merkezi binası için hava perdesi alımı tamamlanmıştır.)
2- Merkezi yemekhanede kullanılmak üzere doğalgazlı yer ocağı alımı	%100 ( 118.800,00 TL harcanarak merkezi yemekhanede kullanılmak üzere doğal gazlı yer ocağı alımı tamamlanmıştır.)
3- Merkezi yemekhane mutfağının havalandırma ve ocak üstü yangın söndürme sistemi alınması	%100 ( 104.400,00 TL harcanarak merkezi yemekhane mutfağının havalandırma ve ocak üstü yangın söndürme sistemi alınması tamamlanmıştır. )
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler;	
1- Dış Hekimliği Fakültesine su arıtma sistemi alım ihalesi.	%100 oranında tamamlanmış olup 825.600 TL ödenek harcanmıştır.
2- Tıp Fakültesi tıbbi simülasyon merkezi alım ihalesi.	%100 oranında tamamlanmış olup 15.528.000 TL ödenek harcanmıştır.
3- Dış Hekimliği Fakültesi uygulamalarında kullanılmak üzere makine ve teçhizat alım ihalesi (489 kalem el aletleri ve 1 adet intraoral simülasyon kabini)	%100 oranında tamamlanmış olup 3.044.058 TL ödenek harcanmıştır.
4- Bozok Evi endüstriyel mutfak ekipmanları alım ihalesi	%100 oranında tamamlanmış olup 643.020 TL ödenek harcanmıştır.
5- İletişim Fakültesine video kamera ve ekipmanları alım ihalesi	%100 oranında tamamlanmış olup 1.252.956 TL ödenek harcanmıştır.
6- Dış Hekimliği Fakültesine tıbbi atık konteyneri alım ihalesi	%100 oranında tamamlanmış olup 955.800 TL ödenek harcanmıştır.
7- Dış Hekimliği Fakültesine malzeme cihaz ve ekipman alım ihalesi (394 kalem malzeme - 8 ayrı firmadan alım yapılmıştır)	%100 oranında tamamlanmış olup 7.291.205 TL ödenek harcanmıştır.
8- Kırtasiye malzemesi ve bayrak alım ihalesi	%100 oranında tamamlanmış olup 1.769.100 TL ödenek harcanmıştır.
9- Dış Hekimliği Fakültesine 9 kısım malzeme alım ihalesi (294 kalem malzeme satın alınmıştır)	%100 oranında tamamlanmış olup 2.248.361 TL ödenek harcanmıştır.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler;	
1- Binaların dış cephe yapım işi, çatı bakım onarım işi, bakım onarım ve sulama sistemi yapım işi, konteyner zemin temel betonu yapım	Yıl içerisinde planlanan ihalelere çıkılmış olup, sözleşmeler imzalanmış ve işin yer teslimi yapılarak, işler tamamlanmış ve geçici

			İşi, Fen Edebiyat Fakültesi konferans salonu çatı kaplama yapım işi ihaleleri	kabulleri yapılmıştır. Ayrıca; üniversitemiz ve bağlı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bakım ve onarım işleri yapılmıştır.
<b>Eğitim</b>	2024H03-233154	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı ve basılı kaynak alımı	Elektronik veri tabanı ve basılı kaynak alımı yapılmıştır.
<b>Sağlık</b>	2024I00-223507	Muhtelif İşler	Hastanemizin teknik ve teknolojik bakımdan faaliyetlerini aksatmadan sürdürebilen, hasta ve çalışan güvenliğini ön planda tutan sağlık sunucu olarak varlığına devam etmesi	Hastanemizde faaliyet gösteren bölümler için yeni tıbbi cihaz ihtiyaçları giderilerek hizmet kalitesi artırılmıştır. Aynı zamanda faaliyetlerine devam eden bölümlerde aktif kullanılan tıbbi cihazların bakım onarımları yaptırılmış etkin ve doğru sonuçlar alınması sağlanmıştır. Hastanemizin ısıtma, soğutma sistemleri düzenli aralıklarla kontrolleri yaptırılarak hizmetin aksamadan sunulmasına olanak sağlanmıştır. Hastane giriş alanlarına sundurma yapılarak hastanemizin ısı kayıpları en aza indirilmiştir.
<b>Sağlık</b>	2024I00-223575	Hastane Ek Binası	Hastanemiz ek binası ile mevcut binamızda faaliyette olan birimlerin işlevsellik ve kullanım alanları artırılarak bina içerisindeki yoğunluk azaltılmış sağlık hizmetinin sorunsuz sürdürülmesi	2024 yılında ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2025 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
<b>DKH SOSYAL</b>	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi	Endüstriyel Kenevir Projesi kapsamında 2022 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri için planlanan ihale, tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yapılamamıştır.  Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Enstitü bünyesinde 2547 sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre; 3 Öğretim Üyesi, 1 Öğretim Görevlisi, 1 Araştırma Görevlisi görevlendirilmiş olup toplam 10 Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 4 Araştırma	Endüstriyel Kenevir Projesi kapsamında 2022 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri tamamlanmış olup, 2025 yılı içerisinde ise 11 adet laboratuvar olarak ayrılan bölümlerin laboratuvar tezgâhlarının yapılması planlanmaktadır.  Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında 2024 yılı içerisinde 1 Profesör ve 4 Araştırma Görevlisi personel alımı gerçekleştirilmiştir. Enstitü bünyesinde; 2024 yıl sonu itibarıyla 2 Profesör, 6 Doçent, 4 Doktor Öğretim Üyesi, 3 Öğretim Görevlisi, 9 Araştırma Görevlisi ve 3 idari personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. 2547 Sayılı Kanunun 13/b-4 maddesine göre



		<p>Görevlisi ve 2 İdari Personel görev yapmaktadır.</p> <p>Kenevir esaslı projeler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 7.585.776,00 TL'lik makine teçhizat ve onarım başlıklarında destek vermiştir. Bu desteğin 2.770.745,09 TL'lik kısmı yürüyen Ar-Ge projelerine makine teçhizat ve laboratuvar malzemesi alımında kullanılmıştır. Kenevir araştırmaları için planlanan hangar yapımı için ihaleye çıkmış ancak sonuç alınamamıştır.</p> <p>2022 yılında BAP birimi tarafından kenevirle ilgili 48 adet toplam 2.176.481,86 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bunların 2.011.449,65 TL bütçeli 43 adet projeye ait destek devam etmekte ve kenevir alanıyla ilgili proje kabulleri de devam etmektedir.</p> <p>Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 1 Adet KOP Projesi, 1 adet TÜBİTAK projesi devam etmektedir.</p> <p>Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu protokol uyarınca MESA Holding tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde 5 üniteden oluşan bir sera kompleksi tamamlanmıştır.</p>	<p>1 Profesör, 1 Doçent, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 temizlik işçisi görevlendirilmekle birlikte Enstitümüzde toplam 32 personel görev yapmaktadır.</p> <p>2024 yılı başlangıç ödeneği olarak 15.000.000,00 TL (On Beş Milyon Lira) gelmiş olup, bunun %10'una (1.500.000,00 TL) "17/05/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmî Gazetede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" kapsamında bloke konmuştur. Ayrıca 2023 yılından harcanmayan 1.908.000,00 TL'lik Likit Ödenek ise Mal ve Malzeme alımı için aktarılmıştır. Böylelikle 2024 yılı toplam ödenek makine ve teçhizat alımında 15.408.000,00 TL'dir.</p> <p>2023 yılında ihalesi yapılan ancak 2023 yılı içerisinde teslimi yapılamayan cihaza ait 814.680,00 TL'lik gider ise 27.03.2024 tarihinde ödenerek bütçe kayıtlarımızda 2024 yılı gideri olarak gerçekleşmiştir. 2024 yılı içerisinde KDV dahil 470.400,00TL'lik 1 kalem Makine ve Teçhizat 4734 Sayılı Kanununun 22/b maddesine (Tek Kaynak yöntemi) 4 kalem Makine ve Teçhizat ise 22/d maddesine göre alımı yapılmıştır. Ancak 08.08.2024 HYS-11854724 onayıyla alımı yapılacak olan Lif Mukavemet ölçüm ile 2024/1087251 İKN li ihale içerisinde yer alan Biyogüvenlik Kabininin Gümrük işlemlerinin gecikmesi ve teslim tarihinde Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın HYS sistemini kapatması dolayısıyla 2024 yılı içerisinde gider gerçekleşmemiştir.</p> <p>2024 yılına kadar (2020-2024) BAP birimi tarafından kenevirle ilgili 79 adet toplam 3.796.569,46 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bunların 1.144.924,60 TL bütçeli 17 adet projeye ait destek devam</p>
--	--	---	--

				<p>etmektedir. Kenevir alanıyla ilgili proje kabulleri de devam etmektedir.</p> <p>4)</p> <p>Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 532.819,46 TL bütçeli 1 adet KOP Projesi 2023 yılından tamamlanmıştır. 2024 yılsonu itibariyle toplam 4.001.330,70TL Bütçeli 11 adet TÜBİTAK projesinin 3.694.249,63TL bütçeli 6 adet TÜBİTAK projesi devam etmektedir.</p> <p>Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu protokol uyarınca MESA Holding tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi Batı Kampüsünde 5 üniteden oluşan sera kompleksi yapımı %100 oranında tamamlanmış ve Enstitümüze teslim edilmiştir.</p>
--	--	--	--	---

2024 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler aşağıdaki şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Binaların Dış Cephe Yapım İşİ	Tamamlandı
Çatı Bakım Onarım İşİ	Tamamlandı
Bakım Onarım ve Sulama Sistemi Yapım İşİ	Tamamlandı
Konteyner Zemin Temel Betonu Yapım İşİ	Tamamlandı
Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Çatı Kaplama Yapım İşİ	Tamamlandı
Led Dönüşüm ve Yangın İhbar Santral Yapım İşİ	Tamamlandı
Kazan Değişimi ve Su Deposu Yapım İşleri	Tamamlandı
Temiz İçme Suyu Hattı Yapım İşİ	Tamamlandı
Periyodik Jeneratör Bakım Onarım İşİ	Tamamlandı

## 2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2024 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H03-921 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2024H03-233156 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2024H03-233154 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2024H03-233152 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2024I00-223507 proje numaralı ‘Muhtelif İşler Projesi’, 2024I00-223575 proje numaralı ‘Hastane Ek Binası Projesi’ ve DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 2021K12-169144 proje numaralı ‘İhtisaslaşma Projesi’ olmak üzere toplam 8 projenin tamamının finansman kaynağı üniversitemiz özel bütçesidir.

2024 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 121.500.000 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 157.422.000 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 131.589.219 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre %108,30 yılsonu ödeneğine göre ise %83,59 nakdi gerçekleştirme sağlanmıştır.

**Tablo18: 2024 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri**

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	20.000.000	17.300.000	17.158.093	99
2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	2.000	792.000	792.000	100
2024H03-233156	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	1.310.000	1.250.959	95
2024H03-233152	Muhtelif İşler(Eğitim)	46.798.000	77.257.000	65.577.961	85
2024H03-233154	Yayın Alımı	3.000.000	2.750.000	2.623.155	95
2024I00-223507	Muhtelif İşler (Sağlık)	23.200.000	29.305.000	28.543.167	97
2024I00-223575	Hastane Ek Binası	13.300.000	13.300.000	240.000	2
2021K12-16944	İhtisaslaşma Projesi(Kenevir)	15.000.000	15.408.000	15.403.881	99
<b>Genel Toplam</b>		<b>121.500.000</b>	<b>157.422.000</b>	<b>131.589.219</b>	<b>84</b>

## 2.1 2024 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

### 2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

**Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
<b>PROJENİN ADI</b>	Kampüs Altyapısı
<b>NUMARASI</b>	2020H03-151810
<b>YERİ</b>	Yozgat
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2020 - 2025
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı

### YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100
2021	13.480.000	1.825.843	-	4.000.000		1.980.000		1.825.843	92
2022	13.480.000	5.428.857		5.500.000		6.414.500		5.428.857	84
2023	24.400.000	7.715.060		15.000.000		7.835.000		7.715.060	98
2024	22.000.000	17.158.093		20.000.000		17.300.000		17.158.093	99

Bu proje kapsamında 2024 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

#### √ Led Dönüşüm ve Yangın İhbar Santral Yapım İşi

Proje kapsamında 27.03.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, İhaleyi kazanan yüklenici ile 22.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 24.04.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Projenin çalışmaları tamamlanmış olup 24.06.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.



### √ Kazan Değişimi ve Su Deposu Yapım İşleri

Proje kapsamında 04.04.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, İhaleyi kazanan yüklenici ile 24.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 03.05.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Projenin çalışmaları tamamlanmış olup 12.07.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.



### √ Temiz İçme Suyu Hattı Yapım İşİ

Proje kapsamında 28.03.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, İhaleyi kazanan yüklenici ile 22.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 24.04.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Proje tamamlanmış olup 02.07.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.



## 2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
<b>PROJENİN ADI</b>	Derslik ve Merkezi Birimler
<b>NUMARASI</b>	2008H03-921
<b>YERİ</b>	Yozgat
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2008 - 2024
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Kenevir Araştırmaları Enstitüsü ve laboratuvarı kompleksi ikmal inşaatı, ticarethane ve konukevi

**YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ**

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2022	11.000.000	-		1.000.000		6.811.000		0	0
2023	20.002.000	7.169.723		6.000.000		8.510.000		7.169.723	84
2024	8.656.000	792.000		2.000		792.000		792.000	100

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında yer alan 2008H03-921 proje numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin başlangıç ödeneği 2.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 792.000 olup, 792.000 TL harcama yapılmıştır.

**2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi****Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri**

<b>SEKTÖR</b>	<b>Eğitim</b>								
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü								
<b>PROJENİN ADI</b>	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
<b>NUMARASI</b>	2024H03-233156								
<b>YERİ</b>	Yozgat								
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2024-2024								
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Etüt-Proje								
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2024	200.000	200.000		200.000		1.310.000		1.250.959	95

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında yer alan 2024H03-233156 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 200.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 1.310.000 TL olmuştur. 1.250.959 TL harcanarak gerçekleşme yüzdesi % 95 gerçekleşmiştir.

## 2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri

<b>SEKTÖR</b>	Eğitim					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Muhtelif İşler					
<b>NUMARASI</b>	2024H03-233152					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2024-2024					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat, kesin hesap					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
<b>2024</b>	46.798.000	46.798.000	46.798.000	77.257.000	65.577.961	85

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında yer alan 2024H03-233152 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 46.798.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 77.257.000 TL olmuş, 65.577.961 harcanarak %85 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

<b>Ekonomik Kod</b>	<b>Açıklama</b>	<b>KBÖ (TL)</b>	<b>Revize Ödenek (TL)</b>	<b>Harcama (TL)</b>
6.1	Mamul Mal Alımları	24.197.000	40.423.000	38.506.632
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	2.000.000	2.465.000	2.454.346
6.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	2.601.000	0	0
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	5.000.000	5.650.000	5.609.286
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	13.000.000	28.719.000	19.007.696
	<b>Toplam</b>	<b>46.798.000</b>	<b>77.257.000</b>	<b>65.577.961</b>

√ **Binaların Dış Cephe Yapım İşi**

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 15.03.2024 tarihinde ihalesi yapılan binaların dış cephe yapım işi kapsamında yüklenici firma ile 04.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 15.04.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmış ve iş tamamlanarak 12.06.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.





#### √ Çatı Bakım Onarım İşi

Proje kapsamında 03.04.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihaleyi kazanan yüklenici ile 24.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 03.05.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. İş tamamlanarak 29.07.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.



#### √ Bakım Onarım ve Sulama Sistemi Yapım İşi

Proje kapsamında 02.04.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihaleyi kazanan yüklenici ile 22.04.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 24.04.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Proje tamamlanmış olup 02.07.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.





√ **Konteyner Zemin Temel Betonu Yapım İşi**

Proje kapsamında 17.09.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihaleyi kazanan yüklenici ile 08.10.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 09.10.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Proje tamamlanmış olup 08.11.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.



√ **Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu Çatı Kaplama Yapım İşi**

Proje kapsamında 29.08.2024 tarihinde ihalesi yapılmış olup, ihaleyi kazanan yüklenici ile 19.09.2024 tarihinde sözleşme imzalanmış ve 27.09.2024 tarihinde işyeri teslimi yapılmıştır. Proje tamamlanmış olup 11.11.2024 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.



**2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi**



Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 2.750.000 TL kaynak öngörülmüş olup, bu tutarın 2.623.155 TL'si harcanmıştır.

## 2.1.6 Sağlık Sektörü Yatırım Projesi

Tablo 24: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

<b>SEKTÖR</b>	Sağlık					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Muhtelif işler					
<b>NUMARASI</b>	2024I00-223507					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2024-2024					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Bakım onarım, büyük onarım, makine-teçhizat					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
<b>2024</b>	23.200.000	23.200.000	23.200.000	29.305.000	28.543.167	97

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında yer alan 2024I00-223507 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 23.200.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ve düşmeleri ile yılsonu revize ödeneği 29.305.000 TL olmuştur. 28.543.167 TL harcanarak % 97 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında 2024 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ **Tıbbi Cihazların Yenilenmesi**

Hastanemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlarımızın bölümlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenileri kazandırılarak bölge halkımızın ihtiyacına sunulmuştur.



√ Hastanemiz radyoloji cihazlarının bakım onarımlarının yapılması



√ Hastanemize yeni endoskopi ünitesi yapılması



√ Hastanemiz giriş alanlarına sundurma yapılması



Tablo 25: Sağlık Sektörü-Hastane Ek Binası

<b>SEKTÖR</b>	<b>Sağlık</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	Hastane Ek Bina					
<b>NUMARASI</b>	2024I00-223575					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2024-2025					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	Hizmet Binası (2.400 m <sup>2</sup> )					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
<b>2024</b>	55.000.000	47.724.000	13.300.000	13.300.000	240.000	2

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında yer alan 2024I00-223575 proje numaralı “Hastane Ek Binası” projesinin başlangıç ödeneği 13.300.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ve düşmeleri ile yılsonu revize ödeneği 29.000.000 TL olmuştur. 240.000 TL harcanarak %1,80 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 26: DKH- İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)

<b>SEKTÖR</b>	<b>DKH-Sosyal</b>					
<b>PROJE SAHİBİ KURULUŞ</b>	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
<b>PROJENİN ADI</b>	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
<b>NUMARASI</b>	2021K12-16944					
<b>YERİ</b>	Yozgat					
<b>BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ</b>	2021-2025					
<b>KARAKTERİSTİĞİ</b>	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
<b>YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ</b>						
<b>YIL</b>	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
<b>2022</b>	15.000.000	-	2.000.000	7.585.776	2.770.745	36
<b>2023</b>	30.000.000	-	10.000.000	14.815.000	12.788.851	86
<b>2024</b>	52.500.000	-	15.000.000	15.408.000	15.403.881	99

Üniversitemiz 2024 Yatırım Programında yer alan 2021K12-16944 proje numaralı projesinin 2024 yılı Başlangıç Ödeneği olarak 15.000.000,00 TL (On Beş Milyon Lira) olup, bunun %10’una (1.500.000,00 TL) “17/05/2024 tarihli ve 32549 sayılı Resmi Gazetede kamu kurum ve kuruluşlarının harcamalarında tasarruf sağlanması, bürokratik işlemlerin azaltılması ve kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli kullanımına ilişkin "Tasarruf Tedbirleri" konulu ve 2024/7 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi” kapsamında bloke konmuştur. Ayrıca 2023 yılından harcanmayan 1.908.000,00 TL’lik Likit Ödenek ise Mal ve Malzeme alımı için aktarılmıştır. Böylelikle 2024 yılı Toplam Ödenek Makine ve Teçhizat alımında 15.408.000,00 TL’dir. Bu ödenekten 15.403.881,77 TL harcanarak % 99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

### 3. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına baėlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır. Üniversitemizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin vize aşamasında deėiştirilirken Üniversitemiz talepleri göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Üniversite hastaneleri ve Diř Hekimliėi Fakülteleri teknolojidaki yenilikler, bilinçlenen ve beklentileri her zaman artan hasta ve hasta yakınları, saėlık sistemindeki gelişmeler vb. nedenlerle kendilerini sürekli geliřtirmek ve yenilemek ihtiyacı içindedirler. Bu kapsamda fiziki mekân, saėlık ve büro malzemesi, insan kaynakları ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir. Genel olarak verilen hastane hizmetlerindeki kalitenin artırılması, hasta ve çalıřan memnuniyetine önem verilmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurulması hastane kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önem taşımaktadır.
