



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

2025 Yılı
Yatırım Değerlendirme Raporu

Değerlendirme Dönemi : 2025 Mali Yılı
Rapor Tarihi : Mart / 2026
Hazırlayan Birim : Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

İÇİNDEKİLER

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ.....	5
1. GENEL DEĞERLENDİRME.....	6
1.1 MİSYON-VİZYON	6
1.2 FAALİYET ALANLARI	7
1.3 TEMEL AMAÇLAR	7
1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	7
1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	9
1.5.1 İnsan Kaynakları	9
1.5.2 Fiziksel Kaynaklar	11
1.6 HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	14
2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	19
2.1 2025 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI	20
2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi	20
2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi	21
2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi	23
2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi	23
2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi	25
2.1.6 Sağlık Sektörü Yatırım Projesi	26
3. ÖNERİLER.....	32

TABLO DİZİNİ

Tablo 1. 2025 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 2. 2025 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 3. 2025 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4. 2025 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	8
Tablo 5. 2025 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	8
Tablo 6. 2023, 2024 ve 2025 Yılları Personel Sayıları	9
Tablo 7. 2023-2024 ve 2025 Yılları Hizmet Sınıfına Göre İdari Personel Sayıları	10
Tablo 8. 2023-2024 ve 2025 Yılları Akademik Personel Sayıları	10
Tablo 9. Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2025 Yılı Verileri)	11
Tablo 10. 2025 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	11
Tablo 11. 2025 Yılı Misafirhane Bilgileri	11
Tablo 12. 2025 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	12
Tablo 13. Sosyal Alanlar	12
Tablo 14. Toplantı – Konferans Salonları	13
Tablo 15. Hizmet Alanları	13
Tablo 16. Taşıt Bilgileri	13
Tablo 17. Kütüphane Kaynakları	13
Tablo 18. 2025 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	19
Tablo 19. Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	20
Tablo 20. Yatırımın Yıllar İtibarıyla Gelişimi	20
Tablo 21. Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	21
Tablo 22. Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	23
Tablo 23. Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	23
Tablo 24. Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödenegi Revize Ödenek ve Harcama	24
Tablo 25. Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	26
Tablo 26. Sağlık Sektörü-Hastane Ek Binası	27
Tablo 27. DKH- İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	28
Tablo 28. DKH- Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	31

GRAFİK DİZİNİ

Grafik 1. Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı.....	8
Grafik 2. Harcamaların Yüzdelik Dağılımı.....	9

ÜST YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2025 yılında toplam 229.700.000 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde ek bütçe, eklemeler ve düşmeler ile birlikte 278.914.000 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2025 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2025 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.

Prof. Dr. Evren YAŞAR
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON-VİZYON



MİSYON

Yozgat Bozok Üniversitesi; bölgesel kalkınma odaklı ihtisaslaşan yönüyle girişimci ve yenilikçi, ülkesine ve insanlığa değer katmada evrensel boyutta değişimleri öngören ve hayata geçiren eğitim anlayışı ile kaliteyi esas alan, bilgi üreten ve üretilen bilginin her düzeyde kullanımıyla değişim, dönüşüm ve gelişim süreçlerini yöneten bir üniversite olmayı görev edinmiştir.

VİZYON

Girişimci ve yenilikçi yüzü ile ürettiği bilgiyi paydaşlarıyla ekonomik değere dönüştüren ve insanlığın hizmetine sunan öncü üniversitelerden biri olmaktır.



1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

1.3 TEMEL AMAÇLAR

Amaç 1- Eğitim-öğretim kalitesini artırmak

Amaç 2- Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje faaliyetlerini artırmak

Amaç 3- Üniversite içinde yenilikçi ve girişimci bir atmosfer geliştirmek

Amaç 4- Toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetleri, iş birliklerini ve sosyal sorumluluk hizmetlerini artırmak

Amaç 5- Kurumsal kapasiteyi geliştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak

1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2025 Yılı Yatırım Programında toplam 9 adet proje için 278.914.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar toplam 263.807.745 TL olarak gerçekleşmiştir.

2025 yılında projeler için öngörülen 278.914.000 TL'nin 253.700.000 TL tutarı hazine yardımı olarak verilmiş; 25.214.000 TL ise likit karşılığı ödenek olarak eklenmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 143.680.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık sektörüne 103.734.000 TL ve DKH Sosyal sektörüne de 31.500.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1. 2025 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
123.200.000	143.680.000	129.536.913	% 105,14	% 90,16


Tablo 2. 2025 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
75.000.000	103.734.000	103.358.600	% 137,81	% 99,64

Tablo 3. 2025 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
31.500.000	31.500.000	30.912.232	% 98,13	% 98,13

Grafik 1. Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı




Tablo 4. 2025 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı

Sektör	Proje No	Proje Ad	2025 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2025H03-258914	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000	1.000.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	4.000.000	4.000.000
	2025H03-258920	Derslik ve Merkezi Birimler	62.000.000	62.000.000
	2025H03-258918	Muhtelif İşler	52.200.000	52.200.000
	2025H03-258916	Yayın Alımı	4.000.000	4.000.000
Sağlık Sektörü	2025I00-246240	Sağlık Muhtelif İşler	55.000.000	55.000.000
	2024I00-223575	Hastane Ek Binası	20.000.000	20.000.000
DKH Sosyal Sektörü	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	30.000.000	30.000.000
	2025K12-246372	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	1.500.000	1.500.000
Toplam			229.700.000	229.700.000

Tablo 5. 2025 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.01	Mamul Mal Alımları	76.000.000	99.712.000	97.454.911
06.03	Gayri Maddi Hak Alımları	5.000.000	3.364.000	3.363.241
06.05	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	87.000.000	113.525.000	107.951.038
06.06	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	20.700.000	20.024.000	18.094.972
06.07	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	41.000.000	42.289.000	36.943.583

Grafik 2. Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı

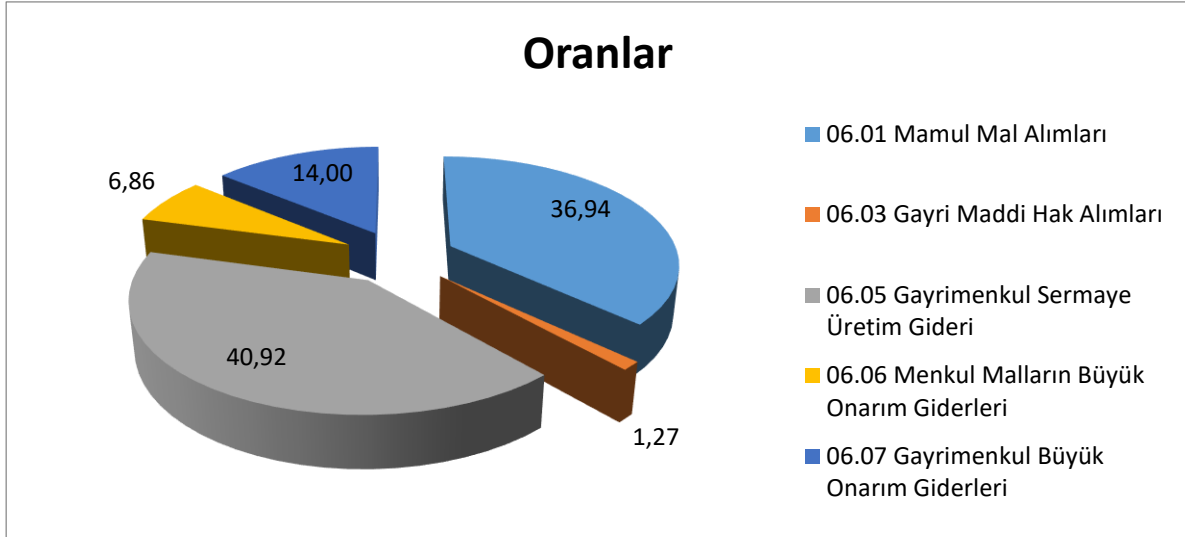

1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2025 yılı itibarıyla üniversitemiz bünyesinde toplam 14 fakülte, 4 yüksekokul, 8 meslek yüksekokulu, 2 araştırma ve uygulama hastanesi, 1 teknopark, 1 teknoloji- transfer ofisi, 2 enstitü ve 23 uygulama ve araştırma merkezi bulunmaktadır.

1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2025 yılında 994 akademik personel, 7 yabancı uyruklu akademik personel, 654 idari personel, 133 sözleşmeli personel ve 436 sürekli işçi olmak üzere toplamda 2224 personelimiz bulunmaktadır. Aşağıdaki tabloda üniversitemiz 2023, 2024 ve 2025 yıllarına ait personel bilgileri ve 2025 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

Tablo 6. 2023, 2024 ve 2025 Yılları Personel Sayıları

Personel Çeşidi	2023	2024	2025	2025 Yılına Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	936	959	994	% 3,65
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	9	7	7	% 0
İdari Personel	689	661	654	-% 1,07
Sözleşmeli Personel	57	113	133	% 17,70
Sürekli İşçi	446	439	436	-% 0,68
Toplam	2137	2179	2224	% 2,07

Tablo 7. 2023-2024 ve 2025 Yılları Hizmet Sınıfına Göre İdari Personel Sayıları

Hizmet Sınıfı	2023	2024	2025
Genel İdari Hizmetler	222	234	227
Teknik Hizmetler	65	63	67
Sağlık Hizmetleri	364	325	322
Avukatlık Hizmetleri	2	2	2
Yardımcı Hizmetler	34	35	34
Diğer Hizmetler	2	2	2
Toplam	689	661	654

Tablo 8. 2023-2024 ve 2025 Yılları Akademik Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2023	2024	2025	2025 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	89	104	120	% 15,38
Doçent	131	145	147	% 1,37
Dr. Öğr. Üyesi	268	287	351	% 22,29
Öğretim Görevlisi	264	260	225	-% 13,46
Araştırma Görevlisi	184	163	151	-% 7,36
Toplam	936	959	994	% 3,65

1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

1.5.2.1: Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.716.322 m² açık alana ve toplam 306.926 m² kapalı alana sahiptir. Kurumun 2025 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Tablo 9. Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2025 Yılı Verileri)

Toplam Açık Alan	7.716.322 m ²
Toplam Kapalı Alan	306.926 m ²
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	211.791 m ²
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	11.812 m ²
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	41.486 m ²
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m ²
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	9.200 m ²
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	16.154 m ²
Kapalı Spor Tesisleri	7.308 m ²
Diğer	3.099 m ²

Tablo 10. 2025 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları

Eğitim Alanı	Amfi (Adet)	Sınıf (Adet)	Bilgisayar Lab. (Adet)	Diğer Lab. (Adet)	Toplam Adet
0-50 Kişilik	49	210	30	178	467
51-75 Kişilik	15	71	1	9	96
76-100 Kişilik	11	67	0	2	80
101-150 Kişilik	3	12	0	0	15
151-250 Kişilik	0	0	0	0	0
Toplam	78	360	31	189	658

Tablo 11. 2025 Yılı Misafirhane Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Lojman	1	680
Uygulama Oteli	1	2.160
Toplam	2	2.840

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m² kapalı alana sahip misafirhane ve Yozgat Merkezde 2.160 m² kapalı alana sahip uygulama oteli ile hizmetine devam etmektedir. Üniversitemiz uygulama oteli, üniversitemiz programlarında ağırladığımız misafirlerin konaklamasında kullanılmakta olup kapasite olarak yetersiz olduğu düşünülmektedir.



Tablo 12. 2025 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Merkezi Yemekhane Binası	1	6.782
Toplam	1	6.782

Merkezi Yemekhane binamız üniversitemiz kampüsünde bulunan bütün öğrencilere, akademik ve idari personele hitap etmekte olup, kapasitesinin artırılması faydalı olacağı düşünülmektedir.

Tablo 13. Sosyal Alanlar

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Merkezi Kütüphane Binası	1	6.076
Kapalı Spor Salonu	1	4.078
Kapalı Halı Saha	1	2.140
Kapalı Tenis Kortu	1	1.090
Futbol Sahası	1	9.600
Toplam	5	22.984

Üniversitemiz kampüsü içerisinde bulunan spor alanları kampüs içerisinde bulunan bütün öğrenci, akademik ve idari personele yönelik olup, yeterli kapasitede olduğu düşünülmektedir.

Tablo 14. Toplantı – Konferans Salonları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Kongre ve Kültür Merkezi	1	8.100
Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Konferans Salonu	1	1.100
Toplam	2	9.200

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



Tablo 15. Hizmet Alanları

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı	1	1.372
Toplam	3	11.812

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük hizmet binası ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı binası ve Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda idari hizmetler vermektedir.

Tablo 16. Taşıt Bilgileri

Taşıtın Cinsi	2023	2024	2025
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	14	14	14
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
Toplam	32	32	32

Tablo 17. Kütüphane Kaynakları

	2025 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	114	177.454	177.568	79.422	177.454	256.876
Dergi Aboneliği Sayısı	-	73.623	73.623	-	73.623	73.623
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	19	19	-	73	73
Toplam	114	251.096	251.210	79.422	251.150	330.572

2025 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; yıllık abonelik yöntemiyle temin edilmiştir.

1.6 HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Sektör	Proje No	Proje Adı	2025 Yılı Hedef	2025 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	LED dönüşüm ve yangın ihbar santral yapım işi, kazan değişimi ve su deposu yapım işleri, temiz içme suyu hattı yapım işi, ihaleleri yapılması	Yıl içerisinde planlanan ihalelere çıkılmış olup, sözleşmeler imzalanmış ve işin yer teslimi yapılarak, işler tamamlanmış ve geçici kabulleri yapılmıştır. Ayrıca; üniversitemiz ve bağlı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda alt yapı işleri yapılmıştır.
Eğitim	2025H03-258920	Derslik ve Merkezi Birimler	Spor Bilimleri Fakültesi İkmal İnşaatı	Yıl içerisinde planlanan Spor Bilimleri Fakültesi İkmal inşaatı yapım işi ihalesi yapılarak geçici kabulü yapılmıştır.
Eğitim	2025H03-258914	Çeşitli Ünitelerin Etit Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması	Dış Hekimliği Fakültesi zemin tespit tutanağı hazırlanması için mühendislik hizmeti alım işi, Turizm Fakültesi uygulama oteli deprem performans analiz yapım işi, Ziraat Fakültesi çatı projesi alım işi gerçekleştirilmiştir.
Eğitim	2025H03-258918	Muhtelif İşler	Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler doğrultusunda;	
			Üniversitemiz birimlerindeki eksik olan fotokopi makinesi, yazıcı, güvenlik kamerası, access point (wifi) alımı	1.350.882,42 TL tutarında bilişim ürün alımı yapılmıştır.
			Üniversitemiz akademik ve idari personeli için bilgisayar yazıcı alımı	1.102.831,11 TL tutarında bilgisayar alımı tamamlanmıştır.
			Yerköy Meslek Yüksekokulu laboratuvar kurulumu	299.400,00 TL tutarında bilgisayar alınarak donatılmıştır.
			Fen Edebiyat Fakültesi laboratuvar kurulumu	213.505,29 TL tutarında bilgisayar alınarak donatılmıştır.
			Bilgi İşlem Daire Başkanlığı bilişim malzemesi (klavye, mouse, SSD, webcam, RAM, toner, vb. alımı	1.663.966,80 TL tutarında donanım/tüketim malzeme alımı yapılmıştır.
			Daire başkanlıkların kullanmış oldukları web otomasyon sistem alımı	Yazılımlar için 3.060.481,62 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
			Üniversitemiz e-imza kullanım alımları	E-imza temini için 519.420,00 TL tutarında ödeme yapılmıştır.
			Ağ altyapısı için güvenlik duvarı alımı	638.400,00 TL tutarında güvenlik duvarı ve lisans alımı yapılmıştır.
			Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen projeler;	
			Kongre ve Kültür Merkezi Bozok Salonu projeksiyon alımı	889.291,18 TL harcanarak Kongre ve Kültür Merkezi Bozok Salonu projeksiyon alımı tamamlanmıştır.

Elektronik batıri alımı	197.500,00 TL harcanarak elektronik batıri alımı tamamlanmıřtır.
Saęlık Kltr ve Spor Daire Bařkanlıęı bnyesinde hizmet veren yemekhanelere buzdolabı alımı	315.840,00 TL harcanarak buzdolabı alımı tamamlanmıřtır.
Kahve makinesi alımı	19.992,00 TL harcanarak kahve makinesi alımı tamamlanmıřtır.
Klima alımı	54.996,00 TL harcanarak klima alımı tamamlanmıřtır.
İdari ve Mali İřler Daire Bařkanlıęı tarafından gerekleřtirilen projeler;	
Mhendislik Fakltesine 2 adet, Tıp Fakltesi ve İktisadi İdari Bilimler Fakltesine 1 adet dev LED ekran alımı	İhale bedeli 2.999.998,91 TL olup ihale % 100 tamamlanmıřtır.
Dięer birimlere verilmek zere daęıtılmak zere Meslek Yksekokulunda bro mobilyası yapılması	Hedef % 35 oranında tamamlanıp 854.400,00 TL deme yapılmıř, artan iřler ve demeler 2026'da devam edecektir.
Boęazlıyan MYO laboratuvarına malzeme alınması	318.000 TL tutarında laboratuvar malzemesi alınarak laboratuvar talebi kısmi olarak karřılanmıřtır.
Diř Hekimlięi Fakltesine laboratuvar malzemesi alınması laboratuvar donatımı	1.613.751 TL tutarında laboratuvar malzemesi alınarak iřin tamamı karřılanmıřtır.
Diř Hekimlięi Fakltesine diř nitleri alınması planlanmaktadır	3.062.214 TL tutarında Diř Hekimlięi Fakltesi'ne diř nitleri alınmıř talebin tamamı karřılanmıřtır.
Hukuk Fakltesi donatımı yapılması	356.310,74 TL tutarında bro mobilyası alınmıř ve donatım hedefi tamamlanmıřtır.
Medya Merkezi Mdrlę fotoğraf makinesi ve drone kamera alımı	313.620 TL tutarında kamera alımı yapılmıř ve hedef gerekleřmiřtir.
niversitemiz ara bakım ve onarımları yapılması planlanarak, arızalı olan ve bakım gerektiren araların tamir edilmesi	4.649.697 TL tutarında bakım onarım yapılmıř ve yatırım bte kodundan karřılanmıřtır. Aralarımızın eski olması sebebiyle hedef ngrlememektedir.
Yapı İřleri ve Teknik Daire Bařkanlıęı tarafından gerekleřtirilen projeler;	
Turizm Fakltesi Uygulama Oteli yangın merdiveni yapımı	Yıl ierisinde planlanan Turizm Fakltesi Uygulama Oteli yangın merdiveni yapım iři ihalesi yapılarak geici kabul yapıldı.
Aęız ve Diř Saęlıęı Hastanesi 1. etap ameliyathane ve dental unit altyapı sistemi yapımı	Yıl ierisinde planlanan Aęız ve Diř Saęlıęı Hastanesi 1. etap ameliyathane ve dental unit altyapı sistemi yapım iři ihalesi ve yapım iři sonulandırılarak geici kabul yapılmıřtır.
Veteriner Fakltesi Hayvan Hastanesi yapım İři	Yıl ierisinde planlanan Veteriner Fakltesi Hayvan Hastanesi yapım iři ihalesi ve yapım iři sonulandırılarak geici kabul yapılmıřtır

			Bakım Onarım İşleri	Ayrıca; üniversitemiz ve bağlı birimlerinden gelen talepler doğrultusunda bakım ve onarım işleri yapılmıştır.
Eğitim	2025H 03-	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı ve basılı kaynak alımı	Elektronik veri tabanı ve basılı kaynak alımı yapılmıştır.
Sağlık	2025I00-246240	Muhtelif İşler	Hastanemizde kullanım ömrü tamamlanan tomografi cihazı için Devlet Malzeme Ofisinde ihale yapıldı.	Devlet Malzeme Ofisinde gerçekleştirilen ihale sonrası 17.545.000 TL tutarında tomografi cihazı alımı yapılmıştır.
			Hastanemiz muhtelif yerlerinde bulunan klimaların, otomatik kapıların, anons sisteminin, su tesisat sistemlerinin tamirlerinin yapılması	Hastanemiz muhtelif yerlerinde ihtiyaç duyulan bakım onarım ve tadilat işleri yapılmıştır.
			Hastanemiz LED steril tavan armatörü değişimi ve acil ek bina alüminyum bölme işlerinin yapılması	İhtiyaç duyulan alanlarda aydınlatma işi tamamlanmış ayrıca acil ek bina için kullanım için alüminyum bölmeler ile kullanılır hale getirilmiştir.
			Isı merkezi sirkülasyon pompası tamiri ve doğalgaz kazanlarında bulunan kaçakların yapılması	Isıtma sisteminde meydana gelen sorunların tamamı giderilmiştir.
			Hastanemiz geneli ihtiyaç duyulan tıbbi cihaz ve ekipmanların yenilenmesi, eksik olanların tamamlanması	C kollu skopi cihazı, defibrilatör, ventilatör, hasta başı monitör, kemik ölçüm cihazı, ESWT cihazı vb. cihazların alımı yapılmıştır.
Sağlık	2024I00-223575	Hastane Ek Binası	Hastanemiz ek binası ile mevcut binamızda faaliyette olan birimlerin işlevsellik ve kullanım alanları artırılarak bina içerisindeki yoğunluk azaltılmış sağlık hizmetinin sorunsuz sürdürülmesi	2024 yılında ihalesi gerçekleştirilmiş olup 2025 yılı içerisinde % 100 oranında tamamlanmıştır.
DKH SOSYAL	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi	Endüstriyel Kenevir Projesi kapsamında 2022 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri tamamlanmış olup, 2025 yılı içerisinde ise 13 adet laboratuvar olarak ayrılan bölümlerin laboratuvar tezgâhlarının yapılması, Ayrıca yapılan bu laboratuvarlara bölümlerin gereksinimini karşılayacak 45 adet Cihazın satın alınması	Kenevir Araştırmaları Enstitüsü binası içerisine 15.05.2025 tarihinde yapılan ihale neticesinde KDV Dâhil 8.939.898,80TL tutarla 13 Adet Laboratuvar Tezgahı, Mobilya ve Çeker Ocak sistemi yapılmıştır. Ayrıca bu laboratuvarlarda kullanılmak üzere 24.06.2025 tarih ve 2025/817026 İKN, 11.07.2025 tarih ve 2025/1007396 İKN, 31.07.2025 tarih ve 2025/1013228 İKN ve 26.08.2025 tarih ve 2025/134083İKN numaralı ihaleler sonucunda 45 Adet laboratuvar cihazları satın alınmış ve kullanıma sunulmuştur. 2025 yılı Başlangıç Ödeneği olarak 30.000.000,00 TL'dir. Önceki yıldan herhangi bir likit aktarım olmamıştır. 2024 yılında ihalesi yapılan ancak 2024 yılı içerisinde teslimi yapılamayan cihazlara ait

				<p>425.748,00 TL'lik gider ise 26.03.2025 tarihinde ödenerek bütçe kayıtlarımızda 2025 yılı gideri olarak gösterilmiştir.</p> <p>Enstitümüzce 2025 yılı planlamalar çerçevesince 15.05.2025 tarihinde 2025/575680 İKN kodu ile Laboratuvar Tezgâhı ve Çeker Ocak ihalesi yapılmış olup, 11.09.2025 tarihi itibarıyla iş bitmiş ve 01.10.2025 tarihinde Muayene Kabul Komisyon kararını vererek 08.10.2025 tarihinde ödeme tamamlanmıştır.</p> <p>24.06.2025 tarihinde 2025/817026 İKN koduyla 24 kalem laboratuvar malzemesi alımı ihalesi yapılmış, yüklenici 5 firmadan kalan ürün ve cihazlar teslim alınarak son ödeme 19.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır.</p> <p>14.07.2025 tarihinde 2025/1007396 İKN koduyla 6 Kalem Laboratuvar malzemesi alımı ihalesi pazarlık usulü ile yapılmış, yüklenici 3 firmaya kalan ve cihazlar teslim alınarak son ödeme 12.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır.</p> <p>31.07.2025 tarihinde 2025/1013228 İKN koduyla 23 Kalem Laboratuvar malzemesi alımı ihalesi yapılmış, yüklenici 9 firmaya kalan ve cihazlar teslim alınarak son ödeme 23.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır.</p> <p>29.08.2025 tarihinde 2025/1340483 İKN koduyla 4 Kalem Laboratuvar malzemesi alımı ihalesi pazarlık usulü ile yapılmış, yüklenici 2 firmaya kalan ve cihazlar teslim alınarak son ödeme 23.12.2025 tarihinde tamamlanmıştır.</p> <p>Ayrıca Yatırım Projesi bütçesinden ihale kapsamında alınamayıp doğrudan teminle tedarik edilen ürünler için toplam 791.520,00TL ödeme yapılmış olup hesap özeti belirtilmiştir.</p>
--	--	--	--	---

			<p>Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında 2025 yılı içerisinde 2 Araştırma Görevlisi personel alımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Kenevir Araştırmaları Enstitüsünde alanında uzman personel yetiştirmek için araştırma görevlisi alımı</p>	<p>Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında 2025 yılı içerisinde 2 Araştırma Görevlisi personel alımı gerçekleştirilmiştir.</p> <p>Enstitü bünyesinde; 2025 yılsonu itibariyle 4 Profesör, 5 Doçent, 6 Doktor Öğretim Üyesi, 2 Öğretim Görevlisi, 10 Araştırma Görevlisi ve 3 idari personel kadrolu olarak görev yapmaktadır. 2547 Sayılı Kanununun 13/b-4 maddesine göre 1 Profesör, 1 Öğretim Görevlisi ve 2 temizlik işçisi görevlendirilmekle birlikte Enstitümüzde toplam 34 personel görev yapmaktadır.</p>
			<p>2025 yılında BAP birimi tarafından kenevirle ilgili projelerin desteklenmesi</p>	<p>2025 yılında BAP birimi tarafından kenevirle ilgili 11 adet toplam 1.710.541,03 TL bütçeli proje desteklenmiş olup, bunların 1.662.541,03 TL bütçeli 9 adet projeye ait destek devam etmekte ve kenevir alanıyla ilgili proje kabulleri de devam etmektedir.</p>
			<p>Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 1 Adet 8.884.000,00TL bütçeli KOP Projesi ve 9 adet toplam 3.778.484,00TL bütçeli TÜBİTAK projesi devam etmektedir.</p> <p>Üniversite-sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü kapsamında, MESA Holding tarafından üniversitemize kazandırılan 5 üniteli sera kompleksinin gerekli tadilat ve gereksinimlerinin tamamlanması</p>	<p>Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında 8.884.000,00 TL bütçeli 1 adet KOP Projesi 2025 yılı içerisinde destek almış ve aynı yıl içerisinde tamamlanmıştır.</p>
DKH SOSYAL	2025K12-246372	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	<p>Makine teçhizat bakım onarımı yapılması</p>	<p>XRD cihazı, saf su cihazı, kyoto su muhtevası cihazı, ups cihazları, vakum pompa bakımları, sem cihazı, mikro elementer cihaz bakım onarımları yapılmıştır.</p>

2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2025 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2025H03-258920 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2025H03-258914 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2025H03-258916 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2025H03-258918 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2025I00-246240 proje numaralı ‘Muhtelif İşler Projesi’, 2024I00-223575 proje numaralı ‘Hastane Ek Binası Projesi’ ve DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe 2021K12-169144 proje numaralı ‘İhtisaslama Projesi’, 2025K12-246372 proje numaralı ‘Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi’ olmak üzere toplam 9 projenin tamamının finansman kaynağı üniversitemiz özel bütçesidir.

2025 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 229.700.000 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 278.914.000 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 263.807.745 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre % 114,84 yılsonu ödeneğine göre ise % 94,58 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 18. 2025 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	4.000.000	3.940.000	3.705.944	94,06
2025H03-258920	Derslik ve Merkezi Birimler	62.000.000	60.325.000	55.951.094	92,75
2025H03-258914	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	1.000.000	1.200.000	234.000	19,50
2025H03-258918	Muhtelif İşler(Eğitim)	52.200.000	74.215.000	65.656.675	88,47
2025H03-258916	Yayın Alımı	4.000.000	4.000.000	3.989.203	99,73
2025I00-246240	Muhtelif İşler (Sağlık)	55.000.000	55.674.000	55.298.599	99,33
2024I00-223575	Hastane Ek Binası	20.000.000	48.060.000	48.059.999	99,99
2021K12-169144	İhtisaslama Projesi(Kenevir)	30.000.000	30.000.000	29.862.247	99,54
2025K12-246372	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi	1.500.000	1.500.000	1.049.984	69,99
Genel Toplam		229.700.000	278.914.000	263.807.745	94,58

2.1 2025 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

Tablo 19. Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ADI	Kampüs Altyapısı
NUMARASI	2020H03-151810
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020 - 2025
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz dönüşümü, elektrik hattı, kampüs içi yol, kanalizasyon hattı, peyzaj, su isale hattı, telefon hattı

Tablo 20. Yatırımın Yıllar İtibarıyla Gelişimi

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100
2021	13.480.000	1.825.843	-	4.000.000	-	1.980.000	-	1.825.843	92
2022	13.480.000	5.428.857	-	5.500.000	-	6.414.500	-	5.428.857	84
2023	24.400.000	7.715.060	-	15.000.000	-	7.835.000	-	7.715.060	98
2024	22.000.000	17.158.093	-	20.000.000	-	17.300.000	-	17.158.093	99
2025	4.000.000	3.705.944	-	4.000.000	-	3.940.000	-	3.705.944	94

√ Bu proje kapsamında 2025 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:




2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 21. Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Derslik ve Merkezi Birimler					
NUMARASI	2025H03-258920					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2025 - 2026					
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Bilimleri Fakültesi İkmal İnşaatı					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL) Toplam	Revize Ödenek (TL) Toplam	Harcama (TL) Toplam	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2025	62.000.000	60.325.000	62.000.000	60.325.000	55.951.094	93

Spor Bilimleri Fakültesi İkmal İnşaatı Yapım İşi ihalesine çıkılmış olup 11/07/2025 tarihinde sözleşme imzalanmış,14/07/2025 tarihinde iş yeri teslimi yapılmış iş bitim tarihi olan 05/12/2025 tarihinde işin geçici kabulü yapılmıştır.

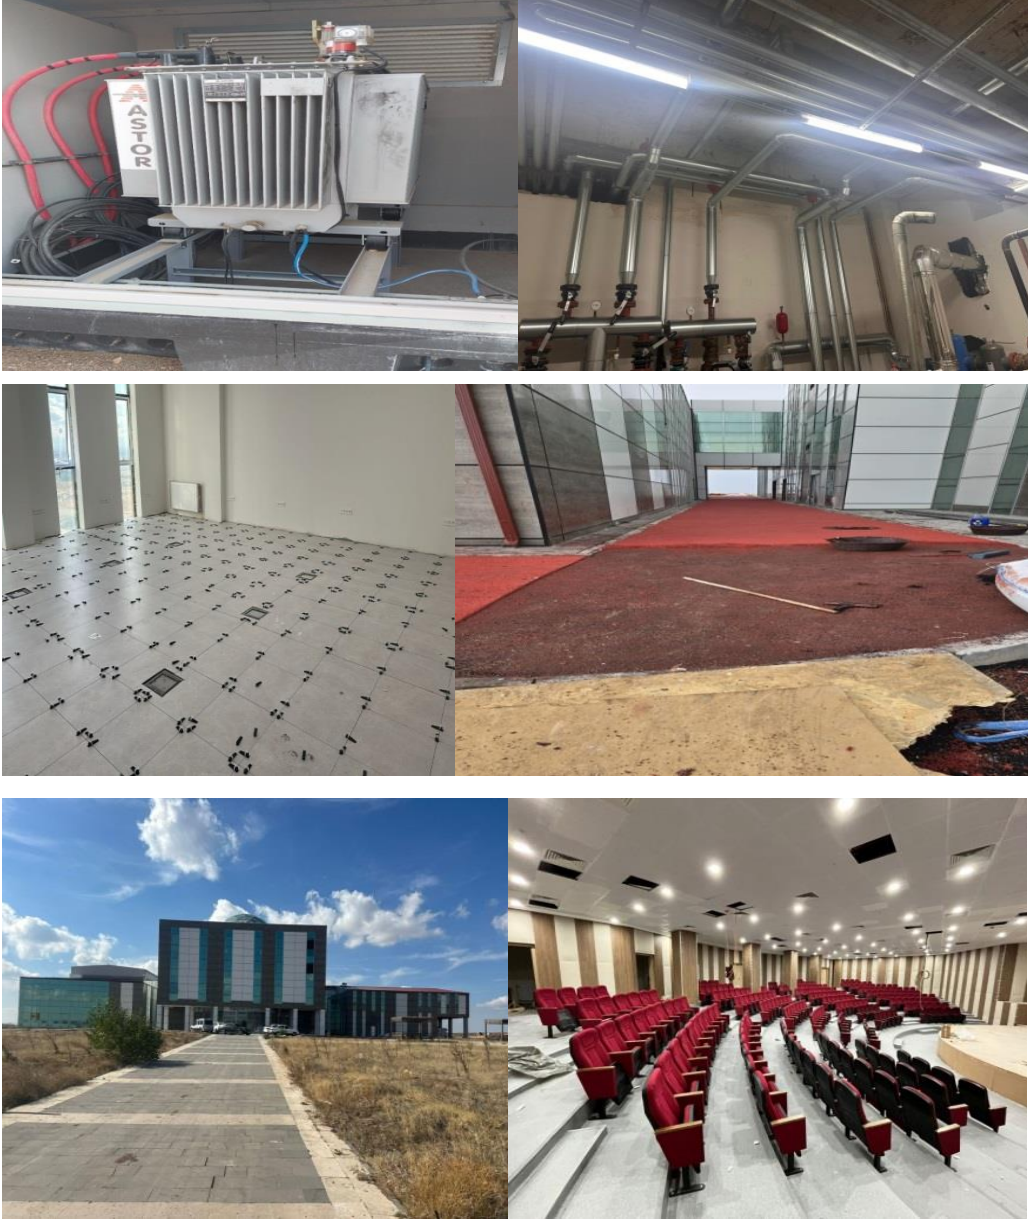

2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi

Tablo 22. Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR		Eğitim							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü							
PROJENİN ADI		Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi							
NUMARASI		2025H03-258914							
YERİ		Yozgat							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2025-2025							
KARAKTERİSTİĞİ		Etüt-Proje							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2025	1.000.000	1.000.000	-	1.000.000	-	1.200.000	-	234.000	19,50

Üniversitemiz 2025 Yatırım Programında yer alan 2025H03-258914 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 1.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 1.200.000 TL olmuştur. 234.000 TL harcanarak gerçekleşme yüzdesi % 19,50 olmuştur.

2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

Tablo 23. Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR		Eğitim							
PROJE SAHİBİ KURULUŞ		Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü							
PROJENİN ADI		Muhtelif İşler							
NUMARASI		2025H03-258918							
YERİ		Yozgat							
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ		2025-2025							
KARAKTERİSTİĞİ		Bakım onarım, bilgi ve iletişim teknolojileri, makine-teçhizat, kesin hesap							
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)			
						Dış	Toplam		
2025	52.200.000	52.200.000	52.200.000	74.215.000	65.656.675		88,47		

Üniversitemiz 2025 yılı yatırım programında yer alan 2025H03-258918 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 52.200.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 74.215.000 TL olmuş, 65.656.675 TL harcanarak % 88,47 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 24. Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
6.1	Mamul Mal Alımları	17.000.000	25.112.000	23.009.373
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	5.000.000	3.364.000	3.363.241
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	11.700.000	11.524.000	10.126.032
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	18.500.000	34.215.000	29.158.029
	Toplam	52.200.000	74.215.000	65.656.675

√ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 1. Etap Ameliyathane ve Dental Ünit Altyapı Sistemi Yapım İşİ

Üniversitemiz Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı tarafından 08/04/2025 tarihinde ihalesi yapılan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi 1. etap ameliyathane ve dental ünit altyapı sistemi yapım işi kapsamında yüklenici firma ile 28/04/2025 tarihinde sözleşme imzalanmış olup, 29/04/2025 tarihinde iş teslimi yapılmış ve işin yapımı tamamlanarak 07/10/2025 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



√ Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Yangın Merdiveni Yapım İşİ

Turizm Fakültesi Uygulama Oteli Yangın Merdiveni Yapım İşİ ihalesine 12/03/2025 tarihinde çıkmış olup, yüklenici ile 03/07/2025 tarihinde sözleşme imzalanmış, 04/07/2025 tarihinde iş teslimi yapılmış ve işin yapımı tamamlanarak 23/10/2025 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



√ Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yapım İşi

Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi Yapım İşi ihalesine 29/07/2025 tarihinde çıkılmış 18/08/2025 tarihinde yüklenici ile sözleşme imzalanarak 19/08/2025 tarihinde iş teslimi yapılmış ve işin yapımı tamamlanarak 06/11/2025 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır.



2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi



Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 4.000.000 TL kaynak öngörülmüş olup, bu tutarın 3.989.203 TL'si harcanmıştır.

2.1.6 Sağlık Sektörü Yatırım Projesi

Tablo 25. Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif İşler					
NUMARASI	2025I00-246240					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2025-2025					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım onarım, büyük onarım, makine-teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2025	55.000.000	55.298.599	55.674.000	55.674.000	55.298.599	99,33


Üniversitemiz 2025 yatırım programında yer alan 2025I00-246240 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 55.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ve düşmeleri ile yılsonu revize ödeneği 55.674.000 TL olmuştur. 55.298.599 TL harcanarak % 99,33 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında 2025 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ Tıbbi Cihazların Yenilenmesi

Hastanemiz bünyesinde ihtiyaç duyulan tıbbi cihazlarımızın, bölümlerimizin ihtiyaçları doğrultusunda yenileri kazandırılarak bölge halkımızın ihtiyacına sunulmuştur.



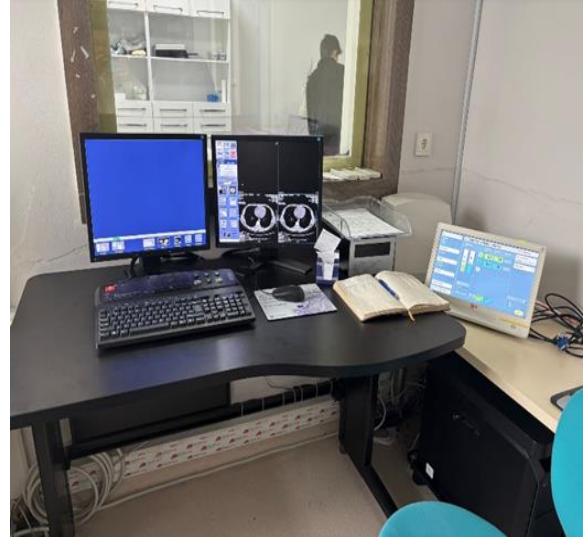

Tablo 26. Sağlık Sektörü-Hastane Ek Binası

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Hastane Ek Bina					
NUMARASI	2024I00-223575					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2024-2025					
KARAKTERİSTİĞİ	Hizmet Binası (2.400 m ²)					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2024	55.000.000	13.300.000	13.300.000	13.300.000	240.000	1,8
2025	72.000.000	48.060.000	20.000.000	48.060.000	48.059.999	99,99

Üniversitemiz 2024 yılında yatırım programında yer alan 2024I00-223575 proje numarası ile yapımına başlanan “Hastane Ek Binası” projesi 2025 yılı başlangıç ödeneği 20.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek ekleme ve düşmeleri ile yılsonu revize ödeneği 48.060.000 TL olmuştur. 48.059.999 TL harcanarak % 99,99 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 18.12.2025 tarihinde geçici kabulü yapılmıştır. 2026 yılında tefrişat eksiklikleri tamamlanarak kullanıma başlanacaktır.



Tablo 27. DKH- İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
NUMARASI	2021K12-169144					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2026					
KARAKTERİSTİĞİ	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2022	15.000.000	-	2.000.000	7.585.776	2.770.745	36,53
2023	30.000.000		10.000.000	14.815.000	12.788.851	86,32
2024	52.500.000		15.000.000	15.408.000	15.403.881	99,97
2025	60.000.000		30.000.000	30.000.000	29.862.247	99,54

√ Üniversitemiz 2025 Yatırım Programında yer alan 2021K12-169144 proje numaralı projesinin 2025 yılı başlangıç ödeneği olarak 30.000.000,00 TL (otuz milyon lira) olarak belirlenmiştir. Bu ödenekten 29.862.247,64 TL harcanarak % 99,54 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Bu proje kapsamında 2025 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ **Laboratuvar Tezgâh Yapımı ve Cihaz Alımı**







Tablo 28. DKH- Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İdamesi					
NUMARASI	2025K12-246372					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2025-2025					
KARAKTERİSTİĞİ	Makine Teçhizat Bakım Onarımı, Teknolojik Araştırma					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Tahmini Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
2025	1.500.000	-	1.500.000	1.500.000	1.049.984	70

Bu proje kapsamında 2025 yılında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

PROJE ADI	AÇIKLAMA
XRD Cihaz Bakım Onarımı	Tamamlandı
Saf Su Cihazı Bakım Onarımı	Tamamlandı
KYOTO Su Muhtevası Cihaz Bakım Onarımı	Tamamlandı
UPS Cihazları Bakım Onarımı	Tamamlandı
Vakum Pompaları Bakım Onarımı	Tamamlandı
SEM Cihazı Bakım Onarımı	Tamamlandı
Mikro Elementer Cihaz Bakım Onarımı	Tamamlandı

3. ÖNERİLER

Üniversitemiz eğitim, sağlık ve sosyal teknolojik arařtırmalar sektöründe yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Ödeneklerin Ayrıntılı Finansman Programı çerçevesinde aylık dönemler halinde serbest bırakılmasına baėlı olarak önceden öngörüsü yapılamayan bazı acil ve zorunlu ihtiyaçlar zamanında karşılanamamaktadır. Üniversitemizce hazırlanan ayrıntılı finansman programları teklifinin vize aşamasında deėiştirilirken üniversitemiz talepleri göz önünde bulundurulması faydalı olacaktır.

Üniversite hastaneleri ve diř hekimliėi fakülteleri teknolojiadaki yenilikler, bilinçlenen ve beklentileri her zaman artan hasta ve hasta yakınları, saėlık sistemindeki gelişmeler vb. nedenlerle kendilerini sürekli geliřtirmek ve yenilemek ihtiyacı içindedirler. Bu kapsamda fiziki mekân, saėlık ve büro malzemesi, insan kaynakları ihtiyaçlarının ivedilikle karşılanması gerekmektedir. Genel olarak verilen hastane hizmetlerindeki kalitenin artırılması, hasta ve çalışan memnuniyetine önem verilmesi, teknolojik ve bilimsel gelişmelere ayak uydurulması hastane kaynaklarının etkin ve verimli kullanılması açısından önem taşımaktadır.
