



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ

**Strateji Geliştirme Daire
Başkanlığı**

**2021 Yılı Yatırım Değerlendirme
Raporu**

Mart 2022

İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	4
GENEL DEĞERLENDİRME	5
MİSYON – VİZYON	5
FAALİYET ALANLARI	6
TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER	6
YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI	6
MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ	8
HEDEFLENEN VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI	13
ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	16
2021 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI	17
ÖNERİLER	24

TABLOLAR DİZİNİ

Tablo 1	2021 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 2	2021 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	6
Tablo 3	2021 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	7
Tablo 4	2021 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	7
Tablo 5	2021 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	7
Tablo 6	2019, 2020 ve 2021 Yılları Personel Sayıları	8
Tablo 7	2019, 2020 ve 2021 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	9
Tablo 8	2019, 2020 ve 2021 Yılları Akademik Personel Sayıları	9
Tablo 9	2021 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	10
Tablo 10	2021 Yılı Misafirhane Bilgileri	11
Tablo 11	2021 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	11
Tablo 12	Sosyal Alanlar	11
Tablo 13	Toplantı – Konferans Salonları	12
Tablo 14	Hizmet Alanları	12
Tablo 15	Taşıt Bilgileri	12
Tablo 16	Kütüphane Kaynakları	13
Tablo 17	2021 Yılı Yatırımlarımız	13
Tablo 18	2021 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	16
Tablo 19	Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	17
Tablo 20	Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	19
Tablo 21	Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	21
Tablo 22	Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	22
Tablo 23	Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödenegi Revize Ödenek ve Harcama	22
Tablo 24	Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	22
Tablo 25	DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma Mer. Lab. İlave Alt Yapı	23
Tablo 26	DKH-Sosyal Sektörü-İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	23

YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanunla kurulmuştur. Kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir üniversite olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan 2021 yılında toplam 30.902.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde eklemeler ve düşmeler ile birlikte 32.652.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi gereğince hazırlanan 2021 Yılı Yatırım Değerlendirme Raporu hazırlanmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
R e k t ö r

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON-VİZYON



MİSYON

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikle, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin coğrafi ve stratejik konumu dikkate alınarak bölgeye sağlık, eğitim sosyo-kültür ve ekonomi alanında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkemizin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürmek.

VİZYON

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.



1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

1.3 TEMEL AMAÇLAR

Amaç-1) Eğitim öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirmek.

Amaç-2) Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını artırmak.

Amaç-3) Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini artırmak.

Amaç-4) Yerleşke alt yapısının üniversite personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak.

Amaç-5) Üniversitemizde girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

1.4 YATIRIMLARIN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Üniversitemiz 2021 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje için 30.902.000 TL kaynak öngörülmüş olup; yıl içerisinde yapılan harcamalar yılsonu toplam 22.174.343 TL olarak gerçekleşmiştir. 2021 yılında yapılan 1.451.952 tutarlı ön ödemeler muhasebe sisteminin devredilmesi sonucu 2022 yılında harcamadan düşülmüş olup mali tablolara yansımıştır.

2021 yılında 30.902.000 TL ödenek hazine yardımı olarak verilmiştir. Üniversitemize eğitim sektöründe 5 proje için toplam 12.900.000 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık sektörüne döner sermaye ile 13.000.000 TL ve DKH sosyal sektöründe 5.002.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2021 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
12.900.000	20.024.898	13.912.446	%107	%69


Tablo 2: 2021 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
13.000.000	7.625.102	6.145.674	%47	%80

Tablo 3: 2021 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneğe Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
5.002.000	5.002.000	2.116.223	%42	%42

Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı

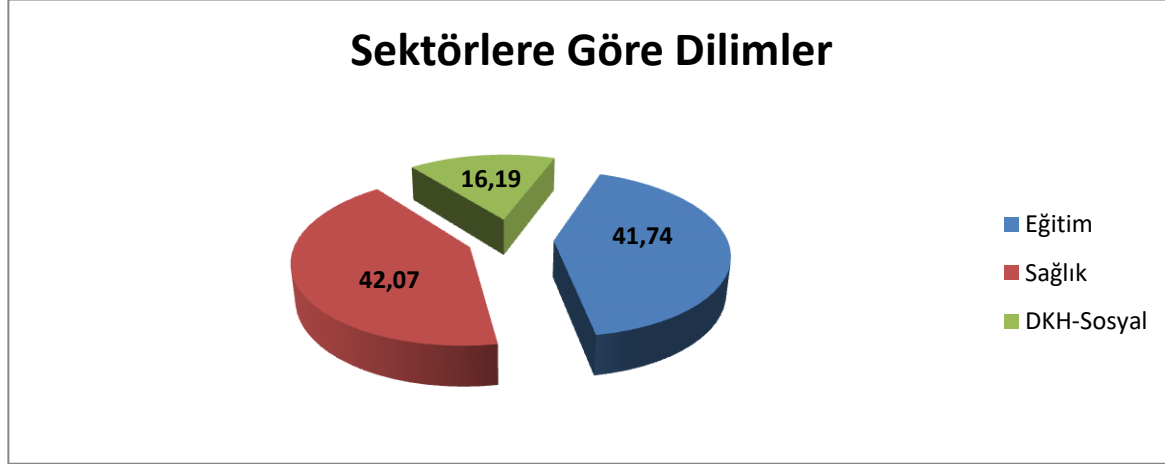


Şekil 1

Tablo 4: 2021 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı

Sektör	Proje No	Proje Ad	2021 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2021H03-167937	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	200.000
	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	4.000.000	4.000.000
	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	6.812.000	6.812.000
	2021H03-167944	Muhtelif İşler	1.138.000	1.138.000
	2021H03-167940	Yayın Alımı	750.000	750.000
Sağlık Sektörü	2021I00-161256	Sağlık Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	13.000.000	13.000.000
DKH Sosyal Sektörü	2018K12-30857	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı	2.000	2.000
	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	5.000.000	5.000.000
Toplam			30.902.000	30.902.000

Tablo 5: 2021 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	12.051.000	16.248.298	12.905.020
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000	650.000	843.926
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	11.013.000	11.517.000	4.349.151
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	4.538.000	1.387.702	1.245.371
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	3.000.000	2.849.000	2.830.875

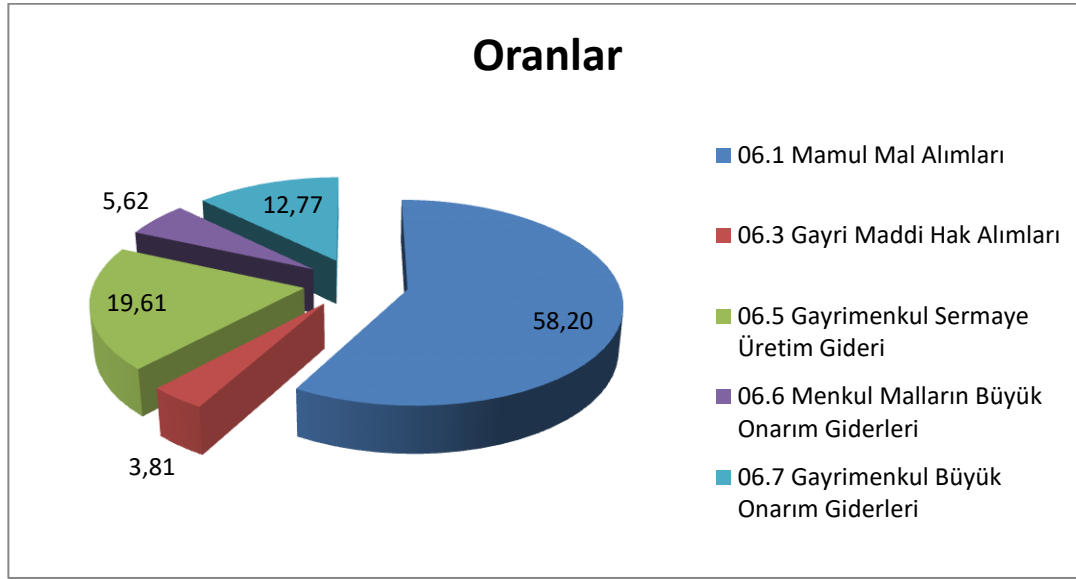Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı

1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

2021 yılı itibarıyla Üniversitemiz bünyesinde toplam 14 Fakülte, 4 Yüksekokul, 8 Meslek Yüksekokulu, 1 Uygulama ve Araştırma Hastanesi, 2 Enstitü ve 18 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2021 yılında 941 akademik, 423 idari personel ve diğer personel olarak toplamda ise 2082 personelimiz bulunmaktadır. 2021 yılsonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %2,95 artış idari personel sayısı ise % 0,04 oranında azalış göstermiştir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2019, 2020 ve 2021 yıllarına ait personel bilgileri ve 2021 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

Tablo 6: 2019, 2020 ve 2021 Yılları Personel Sayıları

Personel Çeşidi	2019	2020	2021	2021 Yılına Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	888	914	941	% 2,95
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	13	12	9	-% 25
İdari Personel	417	425	423	-% 0,04
Sözleşmeli Personel	174	213	247	% 15,96
Sürekli İşçi	370	467	462	-% 1,07
Toplam	1862	2031	2082	% 2,51


Tablo 7: 2019-2020 ve 2021 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları

Hizmet Sınıfı	2019 TOPLAM	2020 TOPLAM	2021 TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	208	216	213
Teknik Hizmetler	63	63	67
Sağlık Hizmetleri	126	124	118
Avukatlık Hizmetleri	2	3	3
Yardımcı Hizmetler	16	17	20
Diğer Hizmetler	2	2	2
Toplam	417	425	423

Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2021 yılında 423 idari personelimiz bulunmaktadır.

Tablo 8: 2019-2020 ve 2021 Yılları Akademik Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2019	2020	2021	2021 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	45	57	65	% 14
Doçent	54	69	101	% 46,3
Dr. Öğr. Üyesi	289	267	247	-% 0,8
Öğretim Görevlisi	249	265	274	% 3,3
Araştırma Görevlisi	251	256	254	% 1
Toplam	888	914	941	% 2,9

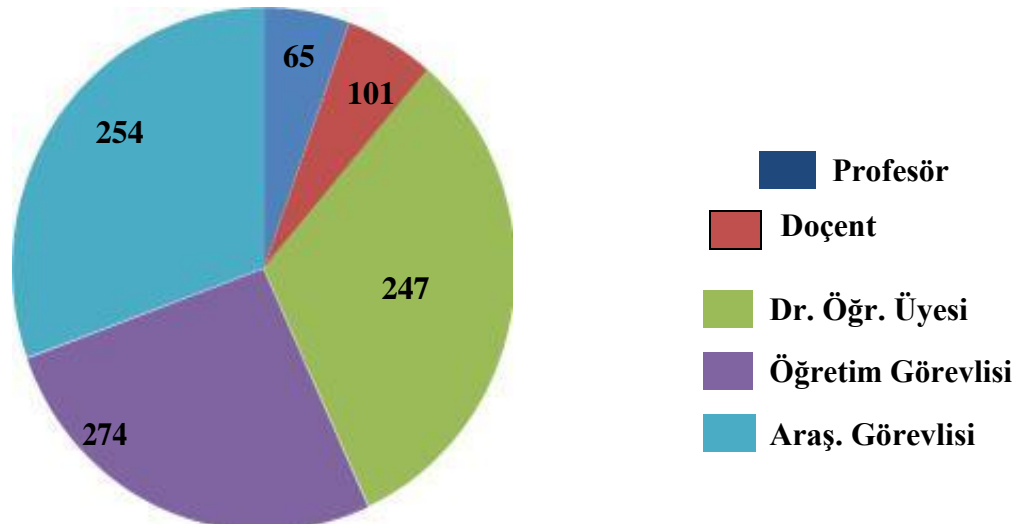

1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

1.5.2.1 Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.709.943,42 m² açık alana ve toplam 317.742 m² kapalı alana sahiptir. Kurumun 2021 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2021 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.709.943,42 m ²
Toplam Kapalı Alan	317.742 m ²
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	223.920 m ²
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	11.812 m ²
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	41.486 m ²
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m ²
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	9.200 m ²
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	15.501 m ²
Kapalı Spor Tesisleri	7.403 m ²
Diğer	2.344 m ²

Tablo 9: 2021 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları

Eğitim Alanı	Amfi	Sınıf(Adet)	Bilgisayar Lab. (Adet)	Diğer Lab. (Adet)	Toplam Adet
0-50 Kişilik	49	213	31	175	468
51-75 Kişilik	15	65	1	4	85
76-100 Kişilik	12	42	0	2	56
101-150 Kişilik	3	9	0	0	12
151-250 Kişilik	0	1	0	0	1
251-Üzeri Kişilik	0	0	2	0	2
Toplam	79	330	34	181	624

Tablo 10: 2021 Yılı Misafirhane Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Lojman	1	680
Uygulama Oteli	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m² kapalı alan sahip misafirhane ile Yozgat Merkezde 2.160 m² kapalı alana sahip Uygulama Oteli hizmetine devam etmektedir.

**Tablo 11: 2021 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri**

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Merkezi Yemekhane Binası	1	6.782

Tablo 12: Sosyal Alanlar

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Merkezi Kütüphane Binası	1	6.076
Kapalı Spor Salonu	1	4.078
Kapalı Halı Saha	1	2.140
Kapalı Tenis Kortu	1	1.090
Futbol Sahası Soyunma Odaları	1	95
Toplam	5	13.479

Tablo 13: Toplantı – Konferans Salonları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Kongre ve Kültür Merkezi	1	8.100
Toplam	1	8.100

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.



Tablo 14: Hizmet Alanları

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m²)
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Toplam	2	10.440

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda hizmet vermektedir.

Tablo 15: Taşıt Bilgileri

Taşıtın Cinsi	2019	2020	2021
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	13	12	12
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
Toplam	31	30	30

Tablo 16: Kütüphane Kaynakları

	2021 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	4.256	2.756.150	2.706.406	71.406	2.758.973	2.830.379
Dergi Aboneliği Sayısı	-	202.824	202.824	-	202.824	202.824
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	14	14	-	59	59
Toplam	4.256	2.958.988	2.909.244	71.406	2.961.856	3.033.262

2021 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; yıllık abonelik yöntemiyle temin edilmiştir.

1.6 HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo 17: 2021 Yılı Yatırımlarımız

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2021 Yılı Hedef	2021 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	Üniversitemiz kampüs alanında altyapı, çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.	Parke Taş Döşeme ve İnşaat Bakım Onarım ihalesi yapılmış ve yıl içinde geçici kabulü yapılmıştır. Ayrıca, Üniversite genelinde; kanalizasyon, elektrik, su, yol ve kaldırım altyapı işleri kapsamında işler yapılmıştır.
Eğitim	2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Spor Bilimleri Fakültesi Binası İnşaatı yapım işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşme % 81 oranındadır. İş bitim tarihi 30.08.2022'dir. Ayrıca Hayırsever İş Adamı Bilal Şahin tarafından Bilal Şahin TÖMER binası yaptırılmış ve aynı yıl içinde teslim alınmıştır.
Eğitim	2021H03-167937	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Kenevir Arş. Enst. Lab. Binası, TÖMER Binası, Camii ve Ticarethane Binası ile Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına Asansör projeleri yaptırılmıştır
Eğitim	2021H03-167944	Muhtelif İşler	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda bakım-onarım ve makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	Üniversitemiz birimlerinden gelen talepler doğrultusunda kullanımda olan yapılarda bakım onarım ve tadilatlar yapılmıştır. Ayrıca, Üniversitemiz ve ilçelerini kapsayacak şekilde Jeneratörlerin Periyodik Bakım İhalesi yapılmıştır.

Eğitim	2021H03-167940	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.
Sağlık	2021H00-161256	Muhtelif İşler	Hali hazırda faaliyet gösteren hastanenin ihtiyaçlarının giderilmesi hedeflenmektedir.	Hastanenin ihtiyaçları karşılanmaktadır.
DKH SOSYAL	2018K12-30857	Merkezi Araştırma Lab. İlave Alt Yapı	Proje sonucunda araştırma merkezimiz, toksikoloji başta olmak üzere sağlık alanında bölgesel ve ulusal alandaki çeşitli problemleri, özellikle son dönemde gerçekleşen zehirlenme vakalarının tespiti ve çözümü konusunda alternatif olacak ve büyük fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, kurumumuz akredite olacak ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda geçerliliği artacaktır. Ayrıca Üniversitemizin Endüstriyel Kenevir alanındaki misyon farklılaşması kapsamında gerçekleştirecek araştırma ve geliştirme faaliyetlerine destek verecektir. Sonuç olarak kurumumuz marka haline gelecek ve uluslararası standartlara sahip laboratuvar olacaktır.	Proje kapsamında altyapı çalışmaları gerçekleştirilmiş, personel eğitimleri ve cihaz validasyon çalışmalarında ilerleme kaydedilmiştir. Ancak 2019 ve 2020 yıllarında projenin iz bedeli ile devam etmiş olması ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından yeterli ödenek tahsisi olmadığından projenin tamamlanması 2021 yılına kalmıştır. İstenilen bütçe ve insan kaynakları sağlanmamıştır.
DKH SOSYAL	2021K12-169144	İhtisaslaşma Projesi	1) Endüstriyel Kenevir İhtisaslaşma Projesi kapsamında 2021 yılında Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'ne tahsis edilen hizmet binasının onarım ve tadilat işlemleri için planlanan ihale, tahsis edilen ödeneğin yeterli olmaması ve döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle yapılamamıştır. 2) Kenevir Araştırmaları Enstitüsü'nün personel ihtiyacının karşılanması kapsamında personel alımı gerçekleştirilmiştir. Enstitü bünyesinde 5 öğretim üyesi, 2 öğretim elemanı, 2 idari personel görev yapmaktadır. 3) Kenevir esaslı projeler için Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı 5 milyon TL tutarlı makine teçhizat ve onarım	

			<p>başlıklarında destek vermiştir. Bu desteğin 2.052.315 TL tutarlı kısmı yürüyen Ar-Ge projeleri için makine teçhizat alımında kullanılmıştır.</p> <p>4) 2021 yılında BAP birimi tarafından yürütülen 32 adet toplam 1.600.000 TL bütçeli proje bulunmaktadır.</p> <p>5) Diğer kurumlar tarafından desteklenen projeler kapsamında bir adet KOP Projesi, bir adet TÜBİTAK projesi devam etmektedir.</p> <p>Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında Yozgat Bozok Üniversitesi ile MESA Holding arasında Endüstriyel Kenevir alanında işbirliği protokolü imzalanmış olup, bu protokol uyarınca MESA Holding tarafından Yozgat Bozok Üniversitesi kampüsünde bir sera yapım çalışmaları başlamıştır.</p>	
--	--	--	--	--

2021 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler aşağıdaki şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
Bilal Şahin TÖMER Binası İnşaatı	Tamamlandı
Berketaş Döşeme ve İnşaat Bakım Onarım İşi	Tamamlandı

2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2021 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2020H03-151810 proje numaralı ‘Kampüs Altyapısı’, 2008H03-921 proje numaralı ‘Derslik ve Merkezi Birimler’, 2021H03-167937 proje numaralı ‘Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi’, 2021H03-167940 proje numaralı ‘Yayın Alımı’, 2021H03-167944 proje numaralı ‘Muhtelif İşler’ yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2021I00-161256 proje numaralı Muhtelif İşler projesi ve DKH Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe Merkezi Araştırma Laboratuvarı ve İlave Alt Yapı Projesi ve İhtisaslaşma Projesi olmak üzere toplam 8 projenin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2021 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 30.902.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 32.652.000,00 TL’ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 22.174.343,00 TL’si harcanarak başlangıç ödeneğine göre % 71,75 yılsonu ödeneğine göre ise % 67,91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır. 2021 yılında yapılan 1.451.952 tutarlı ön ödemeler muhasebe sisteminin devredilmesi sonucu 2022 yılında harcamadan düşülmüş olup mali tablolara yansımıştır.

Tablo18: 2021 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2020H03-151810	Kampüs Altyapısı	4.000.000	1.980.000	1.825.844	92
2008H03-921	Derslik ve Merkezi Birimler	6.812.000	7.562.000	2.408.847	31
2021H03-167937	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	200.000	170.000	114.460	67
2021H03-167944	Muhtelif İşler	1.138.000	9.562.898	8.828.103	92
2021H03-167940	Yayın Alımı	750.000	750.000	735.192	98
2021I00-16156	Muhtelif İşler (Döner Sermaye ile)	13.000.000	7.625.102	6.145.673	80
2018K12-30857	Merkezi Araştırma Lab. – İlave Alt Yapı	2.000	2.000	2.000	100
2021K12-16944	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)	5.000.000	5.000.000	2.114.224	42
Genel Toplam		30.902.000	32.652.000	22.174.343	67

2.1 2021 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ADI	Kampüs Altyapısı
NUMARASI	2020H03-151810
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2020 - 2022
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ

YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği(TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2020	18.000.000	5.463.255	-	5.896.000	-	5.463.255	-	5.463.255	100
2021	13.480.000	1.825.843	-	4.000.000		1.980.000		1.825.844	92

Bu proje kapsamında 2020 ve 2021 yıllarında yapılan başlıca çalışmalar aşağıdaki şekildedir:

√ Sulama Sistemleri Yapım İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu ve Bilal Şahin Batı Yerleşkelerini kapsayacak ve bu alanlarının sulama ihtiyaçlarının karşılamak üzere Sulama Sistemleri Yapım İşi ihalesi yapılarak geçici kabulü yapılmıştır.



√ Gölet Yürüyüş Yolu Yapım İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Doğu Yerleşkesi içerisinde yer alan doğal gölet etrafına yürüyüş yolu yapılarak düzenlemeler gerçekleştirilmiştir.



√ Bilal Şahin Batı Yerleşkesi Batı Nizamiye Giriş Kapısı ve Çevre Düzenleme İşi

Üniversitemiz Bilal Şahin Batı Yerleşkesinin Nizamiye Giriş Kapısı Hayırsever İş insanı Bilal ŞAHİN tarafından hibe olarak yaptırılmıştır. Çevre düzenleme ve ışıklandırma işi ise Üniversitemiz tarafından yaptırılarak teslim alınmıştır.

√ Parke Taş Döşeme ve İnşaat Bakım Onarım İşi

Üniversitemiz kampüslerinde çevre düzenlemelerini gösterir resimler aşağıdadır.



2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN ADI	Derslik ve Merkezi Birimler								
NUMARASI	2008H03-921								
YERİ	Yozgat								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 - 2022								
KARAKTERİSTİĞİ	Spor Bilimleri Fakültesi Yapım İşİ								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek(TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	32.986.000	-		6.812.000		7.562.000		2.408.847	31

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2008H03-921 proje numaralı “Derslik ve Merkezi Birimler” projesinin başlangıç ödeneği TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 7.562.000 TL olmuştur. 2.408.847 TL harcanarak % 31 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

√ Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Binası Yapım İşİ

√ Spor Bilimleri Fakültesi Eğitim Binası yapım ihalesi yapılarak iş yeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. 10.000 m² alana sahip olacak olan Spor Bilimleri Fakültesi Binasının 2021 yılı itibarıyla fiziki gerçekleşmesi % 81 civarındadır. İlgili proje için süre uzatımı verilmiş olup yeni iş bitim tarihi 30.08.2022 tarihi olarak belirlenmiştir.



√ Bilal Şahin TÖMER Binası Yapım İşi

Üniversitemiz için hayırsever iş insanı Bilal ŞAHİN tarafından yaptırılan TÖMER Binası tamamlanarak teslim alınmıştır.



2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi

Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim								
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü								
PROJENİN ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi								
NUMARASI	2021H03-167937								
YERİ	Yozgat								
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2021								
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje								
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)		Gerçekleşme Yüzdesi Toplam (%)
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2021	200.000	200.000		200.000		170.000		114.460	67

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2021H03-167937 proje numaralı “Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi” projesinin başlangıç ödeneği 200.000 TL’dir. 114.460 TL harcama yapılmış ve gerçekleşme yüzdesi % 67 olmuştur.

2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim						
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü						
PROJENİN ADI	Muhtelif İşler						
NUMARASI	2021H03-167944						
YERİ	Yozgat						
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2021						
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, Kesin Hesap						
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ							
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)	
2021	1.138.000	8.828.102	1.138.000	9.562.898	8.828.103	92	

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2021H03-167944 proje numaralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 1.138.000 TL’dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 9.562.898 TL olmuştur. 8.828.102 TL harcanarak % 92 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
6.1	Mamul Mal Alımları	300.000	6.544.898	5.830.361
6.3	Gayri Maddi Hak Alımları	300.000	850.000	843.926
6.6	Menkul Malların Büyük Onarım Gideri	38.000	668.000	654.043
6.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	500.000	1.500.000	1.499.772
	Toplam	1.138.000	9.562.898	8.828.102

2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi

Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 750.000 TL kaynak öngörülmüş olup, bu tutarın 735.192 TL tutarı harcanmış, % 98 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



2.1.6 Sağlık Sektörü Yatırım Projesi

Tablo 24: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

SEKTÖR	Sağlık					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Muhtelif işler					
NUMARASI	2021I00-161256					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2021					
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım onarım-Makina Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2021	13.000.000	6.145.673	13.000.000	7.625.102	6.145.673,58	80

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2021I00-161256 proje numaralı “Sağlık Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 13.000.000 TL’dir. Yapılan ödenek

ekleme ve düşmeleri ile yılsonu revize ödeneği 7.625.102 TL olmuştur. 6.145.673 TL harcanarak % 80 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 25: DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma- Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı					
NUMARASI	2018K12-30857					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2018-2021					
KARAKTERİSTİĞİ	Teknolojik Araştırma -Makina Teçhizat					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama(TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2021	1.413.000		2.000	2.000	2.000	100

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2018K12-30857 proje numaralı “Merkezi Araştırma Laboratuvarı İlave Alt Yapı” projesinin başlangıç ödeneği 2.000 TL’dir. 2.000 TL harcanarak % 100 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 26: DKH- İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)

SEKTÖR	DKH-Sosyal					
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Yozgat Bozok Üniversitesi Rektörlüğü					
PROJENİN ADI	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
NUMARASI	2021K12-16944					
YERİ	Yozgat					
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2021-2025					
KARAKTERİSTİĞİ	İhtisaslaşma Projesi (Kenevir)					
YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi Toplam(%)
2021	5.000.000	-	5.000.000	5.000.000	2.114.224	42

Üniversitemiz 2021 Yatırım Programında yer alan 2021K12-16944 proje numaralı projesinin başlangıç ödeneği 5.000.000 TL’dir. 2.116.223 TL’si harcanarak % 42 oranında nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

3. ÖNERİLER

Üniversitemiz kampüs çalışmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındıracak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleşme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda verilmesi ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vizelenmesi yatırımların kısa sürede gerçekleşmesinde katkı sağlayacaktır.
