



YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI

**2019 YILI YATIRIM PROGRAMI
İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU**



İÇİNDEKİLER

YÖNETİCİ ÖZETİ	4
GENEL DEĞERLENDİRME	5
Misyon – Vizyon	5
Faaliyet Alanları	6
Temel Amaç ve Hedefler	6
Mevcut Hizmet Kapasitesi	9
Hedeflenen ve Gerçekleşen Kapasite Artışı	17
ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU	20
2019 Yılı Yatırım Projesi Uygulamaları	22
ÖNERİLER	33



TABLolar DİZİNİ

2019 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri	TABLO 1	7
2019 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme	TABLO 2	7
2019 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme	TABLO 3	7
2019 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı	TABLO 4	8
2019 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları	TABLO 5	8
2017-2018 ve 2019 Yılları Personel Sayıları	TABLO 6	9
2017-2018 ve 2019 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları	TABLO 7	10
2017-2018 ve 2019 Yılları Akademik Personel Sayıları	TABLO 8	11
2019 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları	TABLO 9	13
2019 Yılı Misafirhane Bilgileri	TABLO 10	13
2019 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri	TABLO 11	13
Sosyal Alanlar	TABLO 12	14
Toplantı – Konferans Salonları	TABLO 13	14
Hizmet Alanları	TABLO 14	15
Taşıt Bilgileri	TABLO 15	15
Kütüphane Kaynakları	TABLO 16	16
2019 Yılı Yatırımlarımız	TABLO 17	17
2019 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri	TABLO 18	21
Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri	TABLO 19	22
Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri	TABLO 20	24
Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri	TABLO 21	27
Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri	TABLO 22	28
Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama	TABLO 23	29
Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı Gerçekleşme Bilgileri	TABLO 24	30
Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler	TABLO 25	31
DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma-Mer. Araş. Lab. İlave Alt Yapı ve Alt Yapı	TABLO 26	32



YÖNETİCİ ÖZETİ

Yozgat Bozok Üniversitesi 1 Mart 2006 tarih ve 5467 sayılı Kanun-la kurulmuştur. Üniversite kurulduğu günden bugüne sürekli gelişen bir kurum olma vizyonu çerçevesinde kendini hep yenilemiştir. Bu yolda her geçen gün büyüyerek ve gelişerek sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan ülkemize, ilimize katkı sağlamak için azimle çalışmaktadır.

Bu hedefe ulaşabilmek için yapılacak yatırımlardan eğitim sektörüne 2019 Mali Yılında toplam 20.500.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Tahsis edilen ödenek, yıl içinde eklemeler ile birlikte 22.220.000,00 TL'ye çıkarılmıştır.

Üniversitemiz, önceki yıllarda olduğu gibi 2019 Mali Yılında da kamu kaynaklarının hesap verebilirlik ve mali saydamlık temelinde etkin ve verimli kullanılmasını amaçlamış olup, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 25. maddesi ile Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğin 24. maddesi uyarınca hazırlanan 2019 Yılı Yatırım Programı İzleme ve Değerlendirme Raporu hazırlanarak kamuoyuna sunulmuştur.

Prof. Dr. Ahmet KARADAĞ
Rektör

1. GENEL DEĞERLENDİRME

1.1 MİSYON-VİZYON



MİSYON

Her açıdan emsalleriyle rekabet edebilecek yeterlilikle, sorumluluk bilinci yüksek, ahlaki değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek; bulunduğu bölgenin coğrafi ve stratejik konumu dikkate alınarak bölgeye sağlık, eğitim sosyo-kültür ve ekonomi alanında katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek, ülkemizin ve insanlığın geleceğine faydalı olacak eğitim ve araştırma faaliyetleri sürdürmek.

VİZYON

Yüksek nitelikli eğitim, araştırma ve proje faaliyetleri yürüten milli ve manevi değerlere sahip bireyler yetiştiren, mezunları tercih edilen, bölgesinin gelişimine yön veren, yenilikçi bir üniversite olmaktır.





1.2 FAALİYET ALANLARI

1. Eğitim
2. Araştırma
3. Girişimcilik
4. Toplumsal Katkı

1.3 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Amaç-1) Eğitim öğretim kalitesini geliştirerek ülkenin ihtiyaç duyduğu nitelikli kaynağı yetiştirmek.

Amaç-2) Sonuçları toplumsal ve ekonomik faydaya dönüşebilen nitelikli bilimsel araştırma ve proje sayısını artırmak.

Amaç-3) Üniversitemizin toplumsal katkı sağlamaya yönelik faaliyetlerini artırmak

Amaç-4) Yerleşke alt yapısının üniversite personeli ve öğrencilerinin eğitim-öğretim, sosyal, kültürel, sanatsal, sportif ve teknolojik ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte geliştirilmesini sağlamak.

Amaç-5) Üniversitemizde girişimcilik kültürünün geliştirilmesini ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

1.4 TEMEL AMAÇ VE HEDEFLER

Üniversitemiz 2019 Yılı Yatırım Programında toplam 8 adet proje için 30.170.000 TL kaynak öngörülmüş olup; toplam harcamalar yıl sonu itibarıyla 20.734.854 TL olarak gerçekleşmiştir.

Bu tutarın 30.170.000 TL'si hazine yardımı olup Üniversitemize 2019 yılında eğitim sektöründe 5 proje için toplam 20.500.000,00 TL, ödenek tahsis edilmiştir. Sağlık Sektörüne Döner Sermaye ile 9.660.000 TL ve DKH Sosyalde ise 10.000 TL ödenek tahsis edilmiştir.

Tablo 1: 2019 Yılı Eğitim Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme Bilgileri

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
20.500.000	22.220.000	13.171.260	%64	%59


Tablo 2: 2019 Yılı Sağlık Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
9.660.000	9.908.000	7.553.593	%78	%76

Tablo 3: 2019 Yılı DKH Sosyal Sektörü Bütçe ve Gerçekleşme

Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Başlangıç Ödeneğine Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)	Revize Ödeneye Göre Gerçekleşme Oranı (Yüzde)
10.000	10.000	9.999	%100	%100

Grafik 1: Başlangıç Ödeneklerinin Sektörler İtibariyle Dağılımı

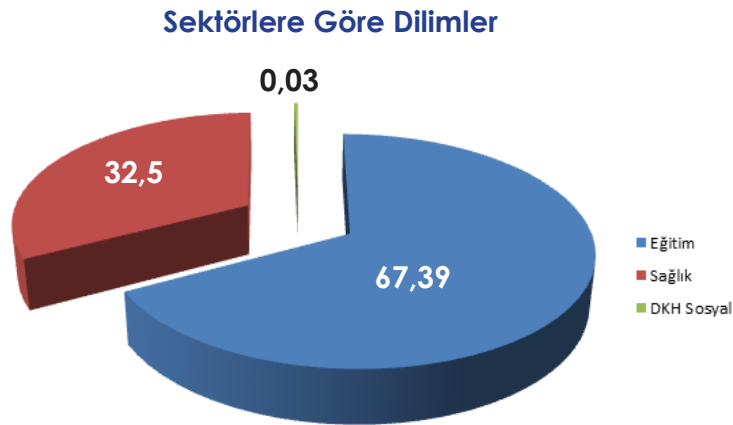


Tablo 4: 2019 Yılı Yatırım Bütçesi Finansman Kaynağı

Sektör	Proje No	Proje Adı	2017 Yılı Başlangıç Ödeneği (TL)	Finansman Kaynağı (Hazine Yardımı)
Eğitim Sektörü	2019H030470	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000	300.000
	2008H031370	Kampüs Altyapısı	2.500.000	2.500.000
	2008H031380	Derslik ve Merkezi Birimler	13.000.000	13.000.000
	2019H030240	Muhtelif İşler	4.300.000	4.300.000
	2019H030610	Yayın Alımı	400.000	400.000
Sağlık Sektörü	2013I000100	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Mak. Teçhizat	8.500.000	8.500.000
	2019I000170	Muhtelif İşler (Döner Sermayeli)	1.410.000	1.410.000
DKH Sosyal Sektörü	2018K121930	Merkezi Araştırma Lab.- İlave Ek Yapı	10.000	10.000
Toplam			30.420.000	30.420.000

Tablo 5: 2019 Yılı Sermaye Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırmaya Göre Dağılımları

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	9.110.000	9.610.000	9.172.600
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000	220.000	300.860
06.5	Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri	18.300.000	17.330.000	8.205.438
06.6	Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri	660.000	660.000	66.552
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	2.000.000	4.218.000	2.985.803

Grafik 2: Harcamaların Yüzdelerle Dağılımı

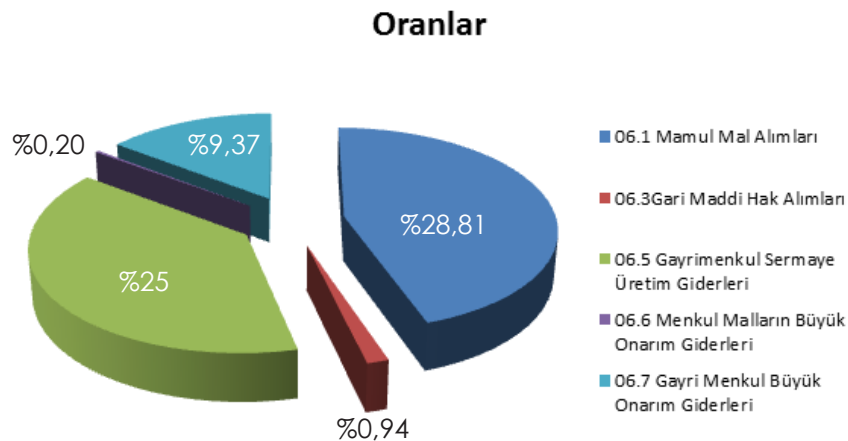

1.5 MEVCUT HİZMET KAPASİTESİ

Üniversitemiz 2019 yılı itibariyle Üniversitemiz bünyesinde toplam 12 Fakülte, 5 Yüksekokul, 9 Meslek Yüksekokulu, 1 Araştırma ve Uygulama Hastanesi, 3 Enstitü ve 15 Araştırma Merkezi bulunmaktadır.

1.5.1 İnsan Kaynakları

Üniversitemiz personel sayılarına bakıldığında 2019 yılında 888 akademik, 417 idari personel olmakla birlikte toplamda ise 1688 personelimiz bulunmaktadır. 2019 yıl-sonu itibarıyla dolu kadro sayıları bazında akademik personel sayısı %4 artma idari personel sayısı ise % 0,2 oranında artma göstermiştir. Aşağıdaki tabloda Üniversitemiz 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait personel bilgileri ve 2019 yılı artış ve azalma oranı yer almaktadır:

Tablo 6 : 2017-2018 ve 2019 Yılları Personel Sayıları

Personel Çeşidi	2017	2018	2019	2019 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Akademik Personel	782	848	888	4
Yabancı Uyruklu Akademik Personel	13	13	13	-
İdari Personel	422	416	417	0,2
Sözleşmeli Personel	43	220	235	6,8
Sürekli İşçi	-	346	370	6,9
Toplam	1260	1843	1923	4,3



Tablo 7: 2017-2018 ve 2019 Yılları Hizmet Sınıfına Göre Personel Sayıları


Hizmet Sınıfı	2017	2018	2019
	TOPLAM	TOPLAM	TOPLAM
Genel İdari Hizmetler	199	203	208
Teknik Hizmetler	60	64	63
Sağlık Hizmetleri	141	130	126
Avukatlık Hizmetleri	2	2	2
Yardımcı Hizmetler	18	15	16
Sözleşmeli	43	220	235
Diğer Hizmetler	2	2	2
Toplam	465	636	652

Üniversitemiz hizmet sınıfına göre personel sayılarına bakıldığında 2019 yılında 417 idari personelimiz bulunmaktadır.

Tablo 8: 2017-2018 ve 2019 Yılları Akademik Personel Sayıları

Personel Sınıfı	2017	2018	2019	2019 Yılı'nın Bir Önceki Yıla Göre Değişimi (%)
Profesör	37	42	45	6
Doçent	42	51	54	5
Dr. Öğr. Üyesi	253	288	289	0,3
Öğretim Görevlisi	193	215	249	13
Araştırma Görevlisi	257	252	251	-0,3
Toplam	782	848	888	2

Grafik 3: 2017 Yılı Akademik Personel Sayıları

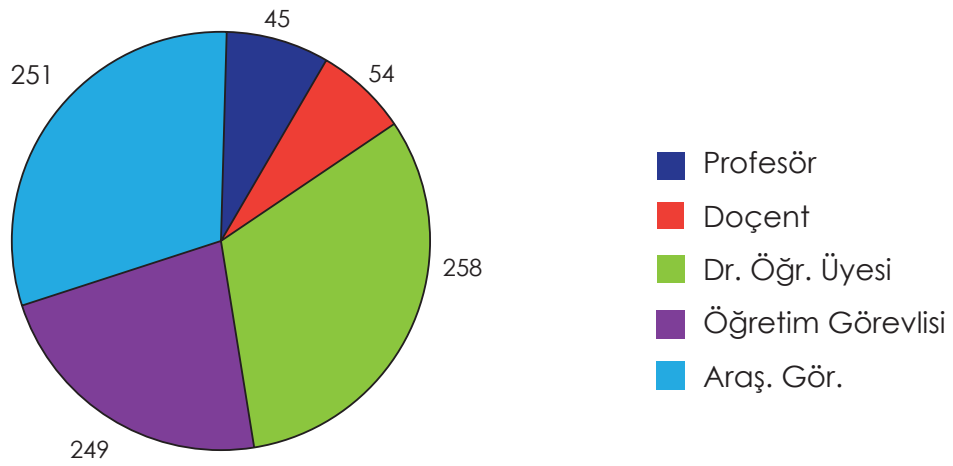



1.5.2 Fiziksel Kaynaklar

1.5.2.1 Taşınmazlar

Üniversitemiz, toplam 7.709.943,42 m² açık alana ve toplam 317.298 m² kapalı alana sahiptir. Kurumun 2019 yılı verilerine göre fiziksel büyüklüğü ve altyapısı aşağıda belirtilmiştir.

Kurumun Fiziksel Büyüklüğü ve Altyapısı (2019 Yılı Verileri)	
Toplam Açık Alan	7.709.943,42 m ²
Toplam Kapalı Alan	306.633 m ²
Eğitim ve Araştırma Amaçlı Binalar	207.123 m ²
Rektörlük ve İdari Birim Mekanlar	10.440 m ²
Sağlık Hizmetine Yönelik Mekanlar	49.761 m ²
Kütüphane Amaçlı Mekanlar	6.076 m ²
Kongre Merkezi/Konferans Salonu	8.100 m ²
Ortak Kullanıma Yönelik Binalar	15.411 m ²
Kapalı Spor Tesisleri	7.403 m ²
Diğer	2.319 m ²

Not: Yerköy Adalet MYO 2.Bina(4.400m²) çıkarılmış, Çekerek Sağ. Hiz. MYO (9.765 m²) eklenmiştir.

Tablo 9: 2019 Yılı Eğitim ve Uygulama Alanları

Kapasite	0-50 (Kişi)	51-75 (Kişi)	76-100 (Kişi)	101-150 (Kişi)	151-250 (Kişi)	Toplam
Amfi	53	15	18	2	0	88
Sınıf	187	67	26	15	1	296
Bilgisayar Laboratuvarları	30	2	0	0	2	34
Diğer Laboratuvarlar	146	5	2	0	0	153
Atölye	0	0	0	0	0	0
Toplam	416	89	46	187	3	571

Tablo 10: 2019 Yılı Misafirhane Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Lojman	1	680
Konukevi	1	2.160

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Yerleşkesinde 680 m² kapalı alan sahip misafirhane ile Yozgat Merkezde 2.160 m² kapalı alana sahip konuk evi hizmetine devam etmektedir.



Tablo 11: 2019 Yılı Yemekhane/Kantin Bilgileri

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Merkezi Yemekhane Binası	1	6.782

Tablo 12: Sosyal Alanlar

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Merkezi Kütüphane Binası	1	6.076
Kapalı Spor Salonu	1	4.078
Kapalı Halı Saha	1	2.140
Kapalı Tenis Kortu	1	1.090
Futbol Sahası	1	9.600
Toplam	5	22.984

Tablo 13: Toplantı – Konferans Salonları

	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Kongre ve Kültür Merkezi	1	8.100
Toplam	1	8.100

Üniversitemiz Kongre ve Kültür Merkezi Binasında 1 adet konferans salonu, 1 adet toplantı salonu ve 8 adet çok amaçlı salon bulunmaktadır.





Tablo 14: Hizmet Alanları

Hizmet Ofisleri	Sayısı (Adet)	Alanı (m ²)
Rektörlük Protokol Binası	1	1.620
Rektörlük Hizmet Binası	1	8.820
Toplam	2	10.440

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsünde idari birimlerin yer aldığı Rektörlük Hizmet Binası ile Yozgat Merkezde bulunan Rektörlük Protokol Binası'nda hizmet vermektedir.

Tablo 15: Taşıt Bilgileri

Taşıtın Cinsi	Göreve Tahsis Edilmiş Kuruma Ait Taşıtlar		
	2017	2018	2019
Binek Otomobiller	7	7	7
Yolcu Taşıma Araçları	13	13	13
Hafif Ticari Araç	-	-	-
Diğer	11	11	11
Toplam	31	31	31

Tablo 16: Kütüphane Kaynakları

	2019 Yılında Alınan Kütüphane Kaynakları			Toplam Kütüphane Kaynakları		
	Basılı	Elektronik	Toplam	Basılı	Elektronik	Toplam
Kitap Sayısı	-	-	-	41217	2821	44038
Dergi Aboneliği Sayısı	-	-	-	-	-	-
Abone Olunan Veri Tabanı Sayısı	-	4	4	-	36	36
Yazma Eser Sayısı	-	-	-	-	-	-
Toplam	-	4	41217	2857	44074	41224

2019 yılında birimlerden gelen veri tabanı talepleri; doğrudan temin yöntemiyle (22/a usulü ile) alınmıştır.



1.6 HEDEFLenen VE GERÇEKLEŞEN KAPASİTE ARTIŞI

Tablo 17: 2019 Yılı Yatırımlarımız

Sektör Adı	Proje No	Proje Adı	2019 Yılı Hedef	2019 Yılı Gerçekleşen
Eğitim	2008H031370	Kampüs Altyapısı	Üniversitemiz kampüs alanında altyapı, çevre düzenlemesi çalışmalarının yapılması hedeflenmiştir.	Kampüs İçi Yol ve Galeri Yapımı işi Tamamlanmış olup kesin kabulü yapılmıştır. Kaldırım ve Yol İhalesi Yapılmış ve tamamlanarak geçici kabulü yapılmıştır. Yerleşke içi yol ihalesine iki kere çıkılmasına rağmen verilen tekliflerin Yaklaşık Maliyetin üzerinde olması nedeni ile ihaleler iptal edilmiştir.
Eğitim	2008H031380	Derslik ve Merkezi Birimler	Üniversitemiz derslik ve hizmet binalarının kapalı alanlarının artırılması hedeflenmiştir.	Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Binası İnşaatı yapım işi devam etmekte olup fiziki gerçekleşme %45 lerededir. İlahiyat Fakültesi İkmal İnşaat Yapım işi ihalesi yapılmış ve işin geçici kabulü yapılmıştır.
Eğitim	2019H030470	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi		"Tıp Fakültesi Morfoloji Binası İnşaatı" nın yapımı için müşavirlik hizmeti alınmaktadır. Üniversitemiz hali hazır haritaların çıkartılması için çalışmalar başlatılmıştır.
				Kazan Değişimi Doğalgaz Dönüşü, Muhelif Binaların Dış Cephe Bakım Onarım, Doğalgaz Tesisat Yapım İş ihaleleri yapılmış ve bu işlere ait geçici kabullerde yapılmıştır.
				-Tıp Fakültesi Anatomi Bölümüne 2019/247689 İKN'lı ihale kapsamında 4 Kalem Laboratuvar malzemesi alınmıştır. -Üniversitemiz kampüsü içerisinde ve nizamiye girişlerinde kullanılmak üzere; 2019/111914 İKN'lı ihale kapsamında Otomatik Bariyer ve Geçiş Kontrol Sistemi Yazılımı ile Diğer Ekipmanları Alım İhalesi yapılmıştır. - Veteriner Fakültesi binası Malzemesi ve Öğrenci Laboratuvarlarına 2019/445070 İKN'lı ihale kapsamında 31 Kalem laboratuvar malzemesi alımı yapılmıştır. -Şefaatli MYO Veterinerlik Bölümüne 2019/525787 İKN'lı ihale kapsamında 16 Kalem Laboratuvar Malzemesi alınmıştır. - Şefaatli MYO Tapu Ve Kadastro Bölümüne 2019/615547 İKN'lı ihale kapsamında 2 kalem laboratuvar malzemesi alınmıştır



Eğitim	2017H030240	Muhtelif İşler	Üniversitemiz ihtiyaçları doğrultusunda bakım onarım ve makine teçhizat alımlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmiştir.	
Eğitim	2019H030610	Yayın Alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı	Elektronik veri tabanı alımı ve basılı kitap alımı yapılmıştır.
Sağlık	2013I000100	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makina Tec.	Yapımı devam eden Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı bitirilmiştir. Makine teçhizat alımları ile ihtiyaçların giderilmesi hedeflenmiştir.	Yapımı biten binanın fiziki gerçekleşmesi %100 seviyelerine ulaştırılmıştır. Makina teçhizat alımları halen devam etmektedir.
Sağlık	2019I000170	Muhtelif İşler	Hali hazırda faaliyet gösteren hastanenin ihtiyaçları giderilmesi hedeflenmektedir.	
DKH SOSYAL	2018K121930	Teknolojik Araştırma	Proje sonucunda elde edilecek veriler sağlık alanındaki çeşitli problemleri, özellikle son dönemde gerçekleşen zehirlenme vakalarının tespiti ve çözümü konusunda alternatif olacak ve büyük fayda sağlayacaktır. Bununla birlikte, kurumumuz akredite olacak ve gerek ulusal gerekse uluslararası alanda geçerliliği artacaktır. Ayrıca Üniversitemiz misyon farklılaşması kapsamında da özellikle analizler konusunda destek sağlayacaktır. Sonuç olarak kurumumuz marka haline gelecek ve uluslararası standartlara sahip laboratuvar olacaktır.	Projenin yapılmasına devam edilmiş ve gerekli altyapı oluşturulmuştur. Fakat proje için Cumhurbaşkanlığı Bütçe ve Strateji Başkanlığı tarafından 2019 yılına ait tahsis edilen bütçe yeterli olmadığından projenin tamamlanması 2020 yılına kalmıştır. 2020 yılında için istenilen bütçe ve insan kaynaklarının sağlanamaması durumunda projenin sonuçlanması zaman alacaktır.

2019 yılında gerçekleştirilen başlıca projeler şu şekildedir.

PROJE ADI	AÇIKLAMA
İlahiyat Fakültesi İkmal İnşaat Yapım İşi	Yapımı Tamamlandı.
Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Binası İnşaatı	Yapımı devam ediyor.
Kazan Değişimi ve Doğalgaz Dönüşüm İşi	Yapımı Tamamlandı.
Kaldırım Yapımı ve Elektrik İşi	Yapımı Tamamlandı.
Muhtelif Binaların Dış Cephe Bakım Onarım İşi	Yapımı Tamamlandı.



2. ÜNİVERSİTEMİZ GENEL YATIRIM UYGULAMA DURUMU

Üniversitemizin 2019 Mali Yılı Yatırım Programında yer alan 2008H031370 proje numaralı 'Kampüs Altyapısı', 2008H031380 proje numaralı 'Derslik ve Merkezi Birimler', 2019H030470 proje numaralı 'Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi', 2019H030610 proje numaralı 'Yayın Alımı', 2019H030240 proje numaralı 'Muhtelif İşler' yatırım projeleri yürütülmüştür. Söz konusu projeler eğitim sektöründe sektöründe yer almaktadır. Sağlık Sektöründe ise 2013I000100 proje numaralı Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makina-Techizat Alımı ve 2019I000170 proje numaralı Muhtelif İşler projesi olmak üzere 2, ve DHK Sosyal-Teknolojik Araştırma Sektöründe Merkezi Araştırma Lab. ve İlave Alt Yapı Projesi olmak üzere toplam 8 projenin tamamının finansman kaynağı özel bütçedir.

2019 yılında yatırım projelerine Merkezi Yönetim Bütçe Kanununda 30.170.000,00 TL ödenek öngörülmüş, yılsonu itibarıyla bu rakam 32.138.000,00 TL'ye yükselmiş, bu ödeneğin ise 20.734.854,00 TL'si harcanarak başlangıç ödeneğine göre %68,73 yılsonu ödeneğine göre ise %64,52 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



Tablo18: 2019 Yılı Yatırım Projeleri Başlangıç Ödenekleri

Proje No	Proje Adı	Başlangıç Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Nakdi Gerçekleşme (TL)	Nakdi Gerçekleşme Oranı (%)
2008H031370	Kampüs Altyapısı	2.500.00,00	-	481.446	19
2008H031380	Derslik ve Merkezi Birimler	13.000.000	-	6.834.677	52
2019H030470	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi	300.000	-	161.149	53
2017H030240	Muhtelif İşler	4.300.000	6.020.000	5.517.485	91
2019H030610	Yayın Alımı	400.000	-	156.277	39
20131000100	Hastane İnşaatı ve Makine Tech. Alımı	8.500.000	7.530.000	6.521.744	86
2019I000170	Muhtelif İşler (Döner Sermaye ile)	1.410.000	2.628.000	1.031.848	39
2018K121930	Merkezi Araştırma Lab. – İlave Alt Yapı	1.000.000		9.999	100
	Genel Toplam				62



2.1 2019 YILI YATIRIM PROJESİ UYGULAMALARI

2.1.1 Kampüs Altyapısı Yatırım Projesi

Tablo 19: Kampüs Altyapısı Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Kampüs Altyapısı
NUMARASI	2008H031370
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 - 2019
KARAKTERİSTİĞİ	Doğalgaz Dönüşümü, Elektrik Hattı, Kampüs İçi Yol, Kanalizasyon Hattı, Peyzaj, Su İsale Hattı, Telefon Hattı

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ									
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)		Revize Ödenek (TL)		Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)	
			Dış	Toplam	Dış	Toplam	Dış	Toplam	
2019	33.000.000	29.307.731	-	2.500.000	-	0	-	481.446,37	20

Bu proje kapsamında 2019 yılında yapılan başlıca çalışmalar şu şekildedir:

√ Kaldırım Yapımı ve Elektrik İşi

Üniversitemiz Erdoğan Akdağ Kampüsü içerisinde Kınalı Hasan Kız Yurdu Arasında öğrencilerimizin yerleşkeye giriş çıkışlarının daha sağlıklı olabilmesi için Kaldırım ve Aydınlatma İşi yapılmıştır.





2.1.2 Derslik ve Merkezi Birimler Yatırım Projesi

Tablo 20: Derslik ve Merkezi Birimler Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Derslik ve Merkezi Birimler
NUMARASI	2008H031380
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2008 - 2019
KARAKTERİSTİĞİ	İlahiyat Fakültesi İkmal İnşaat Yapım İş BESYO Bina Yapım İş

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış Toplam	Dış Toplam	Dış Toplam	
2019	43.878.000	41.461.023	13.000.000	-	6.834.677,31	52

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında yer alan 2008H031380 proje numaralı "Derslik ve Merkezi Birimler" projesinin başlangıç ödeneği 13.000.000 TL'dir. 6.834.677,31 TL'si harcanarak %52'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

√ İlahiyat Fakültesi İkmal İnşaat Yapım İşi

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi mevcut binasının yetersiz olması nedeni ile ek bina inşaatına başlanmış olup 2018 yılında ilgili inşaatın tamamlanması planlanmıştır. Yüklenici firmaya verilen süre uzatımı dahilinde yapım işi tamamlanamadığı için ihale 21/12/2018 tarihinde fesih edilmiştir. Sonrasında İkmal İhalesine çıkmış ve 2019 yılı içerisinde tamamlanarak 2020-2021 Eğitim Öğretime hazır hale getirilmiştir.



√ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun İhalesi yapılmış olup, İş yeri teslimi 31/08/2018 tarihinde yapılmıştır. 10.000m² alana sahip olacak olan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu binasının 2019 yılı sonu itibarıyla fiziki gerçekleşmesi %40 civarındadır. İlgili proje için süre uzatımı verilmiş olup yeni iş bitim tarihi 30.10.2020 tarihidir.



2.1.3 Etüt Proje Yatırım Projesi

Tablo 21: Etüt Proje Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi
NUMARASI	2019H030470
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2019-2019
KARAKTERİSTİĞİ	Etüt-Proje

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış Toplam	Dış Toplam	Dış Toplam	
2019	300.000	540.000	- 300.000	- 0	- 138.850	54

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında yer alan 2019H030470 proje nu-maralı "Çeşitli Ünitelerin Etüt Projesi" projesinin başlangıç ödeneği 300.000 TL'dir. 138.850 TL harcama olmuş ve gerçekleşme yüzdesi %54 olmuştur.



2.1.4 Muhtelif İşler Yatırım Projesi

Tablo 22: Muhtelif İşler Projesi Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Eğitim
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Muhtelif İşler
NUMARASI	2019H030240
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2019-2019
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım Onarım, Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Makine-Teçhizat, T-5 (1 Adet)

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış Toplam	Dış Toplam	Dış Toplam	
2017	4.300.00	6.020.000	4.300.000	6.020.000	5.517.485	91

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında yer alan 2019H030240 proje nu-maralı “Muhtelif İşler” projesinin başlangıç ödeneği 4.300.000 TL'dir. Yapılan ödenek aktarımları ile birlikte yılsonu ödeneği 6.020.000 TL'ye ulaşmış, 5.517.485 TL'si harcanarak %91 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 23: Muhtelif İşler Yatırım Projesi Başlangıç Ödeneği Revize Ödenek ve Harcama

Ekonomik Kod	Açıklama	KBÖ (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)
06.1	Mamul Mal Alımları	2.700.000,00	3.200.000,00	3.196.119,00
06.3	Gayri Maddi Hak Alımları	100.000	320.000,00	300.860,00
06.7	Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri	1.500.000	2.500.000	2.020.506
	Toplam	4.300.000	6.020.000	5.517.485

2.1.5 Yayın Alımı Yatırım Projesi

Üniversitemiz Yayın Alımı Yatırım Projesi için 400.000 TL kaynak öngörülmüş olup; Bu tutarın 156.277,62 TL'si harcanmıştır.



2.1.6 Hastane İnşaatı Yatırım Projesi

Tablo 24: Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı Gerçekleşme Bilgileri

SEKTÖR	Sağlık
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı ve Makine Teçhizat
NUMARASI	2013I000100
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2013-2020
KARAKTERİSTİĞİ	Hastane İnşaatı (46.635 m ²) (200 yatak), Makine-Teçhizat

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış Toplam	Dış Toplam	Dış Toplam	
2019	6.000.000	5.813.803	6.000.000		5.813.803	%96,89

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında yer alan 2013I000100 proje numaralı "Hastane ve Morfoloji Binası İnşaatı" projesinin başlangıç ödeneği 6.000.000 TL'dir. 5.813.803 TL'si harcanarak %96,89 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

Tablo 25: Sağlık Sektörü-Muhtelif İşler

SEKTÖR	Sağlık
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Muhtelif işler
NUMARASI	2019I000170
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2019
KARAKTERİSTİĞİ	Bakım onarım-Mak. Techizat

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış Toplam	Dış Toplam	Dış Toplam	
2019	1.160.000	1.031.848	1.160.000	2.378.000	1.031.848	44

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında yer alan 2019I000170 proje numaralı "Sağlık Muhtelif İşler" projesinin başlangıç ödeneği 1.160.000 TL'dir. 1.031.848 harcanarak %44 nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.



Tablo 26: DKH-Sosyal Sektörü-Teknolojik Araştırma-Mer. Araş. Lab. İlave Alt Yapı ve Alt Yapı

SEKTÖR	DKH-SOSYAL
PROJE SAHİBİ KURULUŞ	Bozok Üniversitesi Rektörlüğü
PROJENİN ; ADI	Mer. Araş. Lab. İlave Alt Yapı
NUMARASI	2018K121930
YERİ	Yozgat
BAŞLAMA/BİTİŞ TARİHİ	2019
KARAKTERİSTİĞİ	Tekn. Araştırma-Mak. Techizat

YATIRIMIN YILLAR İTİBARIYLA GELİŞİMİ						
YIL	Toplam Proje Tutarı (TL)	Toplam Tahmini Harcama (TL)	Program Ödeneği (TL)	Revize Ödenek (TL)	Harcama (TL)	Gerçekleşme Yüzdesi (%)
			Dış Toplam	Dış Toplam	Dış Toplam	
2019	10.000	10.000	10.000	-	9.999	100

Üniversitemiz 2019 Yatırım Programında yer alan 2018K121930 proje nu-maralı "Mer. Araş. Lab. İlave Alt Yapı" projesinin başlangıç ödeneği 10.000 TL'dir. 9.999 TL harcanarak %100 'lik nakdi gerçekleşme sağlanmıştır.

3. ÖNERİLER

Üniversitemiz kampüs çalışmaları kapsamında yatırımlarına hız kesmeden devam etmekte ve bu kapsamda önemli projelere imza atmaktadır. Bu projeler ülkemizi ve ilimizi kalkındırarak olup mali kaynak açısından desteklenmesi önem arz etmektedir.

Üniversitemiz kamu kaynaklarını etkin ve verimli kullanma bilinciyle hareket etmekte ve fiziki gerçekleştirme durumları dikkate alarak ödenek tahsisi sağlanması önem arz etmektedir. Bu çerçevede verilen ödeneklerin ihtiyaçlar doğrultusunda verilmesi ve Ayrıntılı Finansman Programının taleplerimiz dikkate alınarak vizelenmesi yatırımların kısa sürede gerçekleşmesinde katkı sağlayacaktır.

